ANALISIS BIAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN WAKTU LELANG PROYEK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Kasus: LPSE Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1
Pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri




DISUSUN OLEH:
Eko Suyono (12 522 088)

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

LEMBAR PERNYATAAN

Demi Allah, saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Jika dikemudian hari ternyata terbukti pengakuan saya ini tidak benar dan melanggar peraturan yang sah dalam karya tulis dan hak kekayaan intelektual maka saya bersedia ijazah yang telah saya terima untuk ditarik kembali oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Juni 2017



Eko Suyono

12522088

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS BIAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN WAKTU LELANG PROYEK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Kasus: LPSE Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

Nama : Eko Suyono
No. Mahasiswa : 12522088

Yogyakarta, 10 Juni 2017

Dosen Pembimbing



Dwi Handayani S.T., M.Sc.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS BIAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN WAKTU LELANG PROYEK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Kasus: LPSE Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

TUGAS AKHIR

Oleh

Nama : Eko Suyono
No. Mahasiswa : 12 522 088

Telah dipertahankan di depan sidang penguji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Teknik Industri

Yogyakarta, Juni 2017

Tim Penguji

Dwi Handayani, S.T., M.Sc
Pembimbing

Imam Djati Widodo, Dr. Drs.,M.Eng.Sc
Penguji I

Ali Parkhan,Ir.,M.T
Penguji II

Mengetahui,
Kepala Prodi Teknik Industri
Universitas Islam Indonesia

Yuli Agusti Rochman S.T., M.Eng

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karyaku ini kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, doa dan doa yang tidak ada hentinya. Peneliti percaya setiap kemudahan yang peneliti dapatkan tidak lepas dari doa kedua orang tua. Terimakasih bapak ibu yang selama ini sudah membimbing anakmu ini di jalan yang benar. Semoga selalu mendapatkan lindungan Allah SWT dan diberi umur panjang agar anakmu ini diberi kesempatan untuk membahagiakan kalian.

Untuk keluarga Teknik Industri 2012, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan.

HALAMAN MOTTO


شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ
لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٨

QS. Al-Imran Ayat 18:
"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang – orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."


فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٦

QS. Al-Insyirah Ayat 5- :
"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberi rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul analisis bias pengambilan keputusan proyek waktu lelang pada layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) daerah istimewa yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. dan para keluarganya, sahabatnya dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya, semoga diyaumul akhir nanti mendapatkan syafa'atnya.

Tugas Akhir ini wajib ditempuh oleh mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1. Harapannya dari penelitian yang dilakukan dapat membuat hubungan yang harmonis antara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada region Yogyakarta dengan pihak civitas akademika Universitas Islam Indonesia khususnya Prodi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran terlaksananya penelitian Tugas Akhir di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc selaku Dekan Fakultas Teknologi.
2. Bapak Yuli Agusti Rochman, ST,M.Eng selaku ketua Prodi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Insdonesia Yogyakarta.
3. Ibu Dwi Handayani S.T., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih atas bimbingan pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk saat ini maupun dikehidupan yang akan datang kepada penulis selama masa pengerjaan Tugas Akhir.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai lembaga yang memperbolehkan mengambil data untuk melakukan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua ku yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan nasehat–nasehat yang sangat bemanfaat bagi penulis. Mohon maaf bila anakmu ini terlambat menyelesaikan tanggung jawab dibangku perkuliahan ini.
6. Terimakasih kepada adik-adik ku tersayang yang telah memberikan nasehat dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dibangku perkuliahan ini.
7. Terimakasih untuk teman dekat penulis Septiansyah, Febri Sundari, Nopen Meisaroh, Angga Mahardika, Mitasya Susilo, Rolandi Ariwibowo, Rizki Febrianta, Arin Prasetyo, Aldi Pranata, dan Rizky Juliansyah yang telah meberikan dukungan kepada penulis selama pengerjaan Tugas Akhir.
8. Terimakasih kepada seluruh mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2012 atas kekeluargaan yang telah dijalin selama ini.
9. Serta semua pihak yang banyak membantu penulis selama penelitian Tugas Akhir ini yang tidak mampu penulis sampaikan disini sebab takkan cukup menggambarkan rasa terima kasih melalui kata pengantar ini.

10. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan sekalian serta dari semua pihak sebagai perbaikan untuk penyusunan Tugas Akhir yang akan datang. Semoga hasil penelitian Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis khusunya dan pembaca pada umumnya, Amin.

Billahitaufiqwalhidayah
Wassalmu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juni 2017

(Eko Suyono)

ABSTRAK

Proyek merupakan kegiatan yang memiliki batas waktu (deadline), artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang ditentukan. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat ini adalah e-tendering yang *dimana penentuan penjadwalannya berdasarkan waktu deterministik yang sering sekali terjadi keterlambatan proses lelang. Pada penelitian ini maka dilakukan eksplorasi bias dalam mengestimasi waktu overall project time dan activities project time pada waktu lelang proyek LPSE. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya fenomena judgmental biases dalam pengambilan keputusan estimasi waktu tendering LPSE. Dari hasil perhitungan bias yang dilakukan didapatkan bias yang terjadi pada LPSE Provinsi Yogyakarta, LPSE kota Yogyakarta, LPSE gabungan wilayah kota, dan LPSE gabungan seluruh wilayah Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan analisis bias tahapan yang paling berpengaruh terhadah bias yang terjadi diwilayah Yogyakarta adalah tahapan evaluasi dokumen pascakualifikasi, dan tahapan pengumuman pemenang yang penyebab dari bias yang terjadi pada tahapan tersebut adalah human eror dan permasalahan pada server aplikasi. Penelitian ini juga menemukan pola distribusi data yang mewakili waktu lelang proyek LPSE Wilayah Yogyakarta adalah Beta [17,, 146, 2,, 27,7] yang mana distirubusi ini dapat dijadikan patokan dalam analisis resiko proyek.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II KAJIAN LITERATUR 6
2.1 Kajian Deduktif 6
2.1.1 Pengertian Manajemen Proyek 6
2.1.2 Keterlambatan Proyek 8
2.1.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 8
2.1.4 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 9
2.1.5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 10
2.1.6 Tahap LPSE 10
2.1.7 Metode E-Tendering 11
2.1.8 Judgmental Biases 11
2.1.9 One Sample t-Test 13
2.1.10 Independent Sample t-Test 14
2.1.11 Anova Satu Arah (One Way Anova) 15

2.2 Kajian Induktif 17
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1 Objek Penelitian 19
3.2 Jenis Data 19
3.3 Metode Pengumpulan Data 19
3.4 Pengolahan dan Analisis Data 20
3.4.1 Teknik Pengolahan Data 20
3.4.2 Analisis Hasil 20
3.4.3 Kesimpulan Dan Saran 20
3.5 Perancangan Penelitian 21
3.6 Alur Penelitian 23
3.7 Hasil Penelitian 24
BAB IV METODE PENELITIAN 25
4.1 Pengumpulan Data 25
4.2 Karakteristik Proyek Lelang Pada LPSE 26
4.3 Data Waktu Lelang Proyek LPSE pada Wilayah Provinsin Yogyakarta 27
4.4 Perhitungan Akurasi Estimasi Waktu Lelang Proyek 31
4.4.1 Perhitungan Akurasi Estimasi *Overall Project Time* 32
4.4.2 Perhitungan Akurasi Estimasi Total *Activity Time* 35
4.5 Analisis Bias Akurasi Estimasi Waktu Lelang Proyek 39
4.6 Perhitungan Bias Akurasi estimasi Kota, dan Provinsi 46
4.7 Perhitungan Bias Akurasi Estimasi antara Kota-kota 48
4.8 Distribusi Waktu Aktual 49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 52
5.1 Kajian Bias pada LPSE Wilayah Provinsi Yogyakarta 52
5.2 Analisis Akurasi Waktu Overall dan Total Aktivitas 52
5.3 Bias Waktu Overall dan Total Aktivitas 53
5.4 Bias LPSE Anatara Kota, dan Provinsi 56
5.5 Distribusi Waktu Lelang 57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 58
6.1 Kesimpulan 58
6.2 Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN..... 62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tahapan Lelang LPSE.....25
Tabel 4.2 Jumlah Proyek Per Wilayah.....25
Tabel 4.3 Data Profil Provinsi Yogyakarta.....27
Tabel 4.4 Data Profil Kabupaten Bantul.....28
Tabel 4.5 Data Profil Kabupaten Sleman.....28
Tabel 4.6 Data Profil Kabupaten Kulon Progo.....29
Tabel 4.7 Data Profil Kabupaten Gunung Kidul.....29
Tabel 4.8 Data Profil Kota Yogyakarta.....30
Tabel 4.9 Perhitungan Akurasi *Overall* Provinsi Yogyakarta.....32
Tabel 4.10 Perhitungan Akurasi Kabupaten Sleman.....33
Tabel 4.11 Perhitungan Akurasi *Overall* Kabupaten Kulon Progo.....33
Tabel 4.12 Perhitungan Akurasi *Overall* Kabupaten Gunung Kidul.....34
Tabel 4.13 Perhitungan Akurasi *Overall* Kota Yogyakarta.....34
Tabel 4.14 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Provinsi Yogyakarta.....35
Tabel 4.15 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kabupaten Sleman.....37
Tabel 4.16 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kab.Kulon Progo.....37
Tabel 4.17 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kab.Gunung Kidul.....37
Tabel 4.18 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kota Yogyakarta.....38
Tabel 4.19 Ringkasan Uji Hipotesis Akurasi Estimasi *Overall*.....40
Tabel 4.20 Ringkasan Uji Hipotesis Akurasi Estimasi Aaktivitas.....41
Tabel 4.21 Permasalahan Bias Provinsi Yogyakarta.....44
Tabel 4.22 Permasalahan Bias Kota Yogyakarta.....45
Tabel 4.23 Permasalahan Bias Gabungan Kota.....45
Tabel 4.24 Permasalahan Bias Seluruh Wilayah.....46
Tabel 4.25 Hasil Uji Beda Antara Kota Dan Provinsi Waktu *Overall*.....47
Tabel 4.26 Hasil Uji Beda Antara Kota Dan Provinsi Total Aktivitas.....48
Tabel 4.27 Hasil Uji *Anova Overall Project Time*.....48
Tabel 4.28 Hasil Uji *Anova* Total *Activity Project Time*.....49
Tabel 5.1 Bias Akurasi *Overall Time*.....53
Tabel 5.2 Bias Akurasi Total *Activity Time*.....54
Tabel 5.3 Rank Perubahan Tahapan.....54

Tabel 5.4 Permasalahan Bias Seluruh Wilayah Yogyakarta.....55
Tabel 5.5 Tabel Penyebab Bias Tiap Tahapan.....56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cakupan Manajemen Proyek. 6
Gambar 2.2 Hubungan Waktu Siklus Proyek 8
Gambar 2.3 Struktur LPSE 9
Gambar 2.4 *Two Tail* 14
Gambar 2.5 *One Tail* 14
Gambar 3.1 *Flowchart* Penelitian 23
Gambar 4.1 Diagram Karakteristik Proyek LPSE 26
Gambar 4.2 *One Tail* tingkat signifikansi α 40
Gambar 4.3 Bias Tahapan LPSE Provinsi Yogyakarta 42
Gambar 4.4 Bias Tahapan LPSE Kota Yogyakarta 43
Gambar 4.5 Bias Tahapan LPSE Gabungan Seluruh Kota 43
Gambar 4.6 Bias Tahapan LPSE Gabungan Seluruh Wilayah 44
Gambar 4.7 Hasil Distribusi *Overall* Wilayah Yogyakarta 50
Gambar 4.8 Pola Data Distribusi Wilayah Yogyakarta 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Proyek adalah kegiatan yang sistematis dan memiliki sifat unik dan temporer (PMI, 2008). Proyek dapat diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dengan mengalokasikan sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau *deliverable* yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1999). Semakin maju peradaban manusia, semakin besar dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan penggunaan bahan-bahan (material), tenaga kerja, dan teknologi yang makin canggih. Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (*deadline*), artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah ditentukan. Berkaitan dengan masalah proyek ini maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek tepat pada waktunya merupakan tujuan yang penting baik bagi pemilik proyek maupun kontraktor.

Demi kelancaran jalannya sebuah proyek dibutuhkan manajemen yang akan mengelola proyek dari awal hingga proyek berakhir, yaitu manajemen proyek. Bidang manajemen proyek tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan dalam dunia industri modern untuk mengkoordinasi dan mengendalikan berbagai kegiatan yang kian kompleks. Manajemen proyek mempunyai sifat istimewa, dimana waktu kerja manajemen dibatasi oleh jadwal yang telah ditentukan. Perubahan kondisi yang begitu cepat menuntut setiap pimpinan yang terlibat dalam proyek untuk dapat mengantisipasi keadaan, serta menyusun bentuk tindakan yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan bila ada konsep perencanaan yang matang dan didasarkan pada data, informasi, kemampuan, dan pengalaman. Dalam manajemen proyek terdapat tiga hal yang penting diutamakan yaitu: Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian proyek.

Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan sering kali disebabkan kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kuran efektif, sehingga kegiatan proyek tidak efisien, hal ini akan mengakibatkan keterlambatan, menurunnya kualitas pekerjaan, dan membengkaknya biaya pelaksanaan. Keterlambatan penyelesaian proyek

sendiri merupakan suatu kondisi yang sangat tidak dikehendaki, karena hal ini dapat merugikan semua pihak baik dari segi waktu maupun biaya. Dalam kaitannya dengan waktu dan biaya produksi, lembaga yang terlibat harus bias merencanakan waktu yang seefisien mungkin dalam setiap kegiatan atau aktivitas, sehingga biaya dapat diminimalkan dari rencana semula.

Suatu proyek dapat dikatakan baik jika penyelesaian proyek tersebut efisien, ditinjau dari segi waktu dan biaya serta mencapai efisiensi kerja, baik manusia maupun alat. Perencanaan kegiatan-kegiatan proyek merupakan masalah yang sangat penting karena perencanaan kegiatan merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan dan agar proyek yang dilaksanakan dapat selesai dengan waktu yang optimal. Pada tahapan perencanaan proyek, diperlukan adanya estimasi durasi waktu tendering pelaksanaan proyek. Realita di lapangan menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sebuah proyek bervariasi, akibatnya perkiraan waktu penyelesaian suatu proyek tidak bisa dipastikan akan dapat ditepati. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya fenomena *judgmental biases* dalam pengambilan keputusan.

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pada penelitian ini dapat mengidentifikasi *judgmental* bias pada penentuan estimasi waktu tendering proyek di LPSE. Variabel yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah proyek di Provinsi Yogyakarta yang nanti setiap proyek diambil dari Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Yogyakarta berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mendapatkan judul penelitian yaitu "**Analisis Bias Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Waktu Lelang Proyek Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah Istimewa Yogyakarta".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat bias estimasi dalam keputusan penentuan waktu lelang proyek dengan waktu aktual pada LPSE Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bias estimasi yang paling banyak terjadi pada tahapan lelang di LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya bias di LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pola distribusi yang dihasilkan pada LPSE porvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan di LPSE yang ada di regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian dilakukan pada proyek pengadaan memiliki 14 tahapan aktivitas.
3. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena *judgmental biases*.
4. Penelitian hanya mengkaji tentang bias negatif atau keterlambatan waktu lelang proyek.
5. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan observasi dan analisis bagamana bias yang terjadi di LPSE yang ada di regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bias estimasi yang sering terjadi pada tahapan lelang di LPSE yang ada di regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui permasalahan penyebab terjadinya bias estimasi di LPSE yang ada di regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui pola distribusi waktu lelang proyek pada LPSE yang ada di regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, tentunya ada hasil yang diharapkan oleh peneliti sebagai sebuah proses pembelajaran, diantaranya:

1. Memberikan gambaran pada lembaga untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan penentuan waktu lelang proyek, sehingga dapat mengoptimalkan jalannya sebuah proyek.
2. Memberikan informasi mengenai daerah yang sering terjadi bias estimasi di LPSE yang ada di regional Provinsin Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sebagai tambahan referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah gambaran mengenai isi yang dibahas pada laporan Tugas Akhir ini, yang dimana dibagi menjadi enam pokok bahasan yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

BAB II ini berisikan tentang kajian induktif dan kajian deduktif. Dimana kajian deduktif berisikan dasar teori yang berfungsi sebagai materi yang dapat membantu memecahkan masalah ataupun sebagai informasi, pendukung serta untuk memberikan pemahaman akan permasalahan yang akan di teliti.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

BAB III ini menjelaskan tentang objek penelitian yang akan digunakan di penelitian ini, teknik pengumpulan data, *flowchart* penelitian.

BAB IV: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB IV berisikan tentang data-data yang sudah diperoleh dan akan di olah menggunakan metode yang sudah ditentukan. Dimana data yang diolah akan dianalisis juga dari hasil yang diperoleh.

BAB V: PEMBAHASAN

BAB V berisikan tentang analisis dari hasil penelitian yang diperoleh dimana analisis itu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan ringkasan singkat mengenai hasil penelitian yang sudah dianalisis sedangkan pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Untuk saran berisikan tentang ide penulis untuk lebih mengembangkan penelitian yang serupa dari penelitian-penelitian sebelumnya agar menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BAB II
KAJIAN LITERATUR

2.1 Kajian Deduktif

2.1.1 Pengertian Manajemen Proyek

Manajemen proyek terdiri dari dua kata yaitu "Manajemen" dan "Proyek". Menurut Husen (2009:2), manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikanm memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi (lembaga) yang telah ditentukan (Soeharto, 2001:21). Sedangkan proyek merupakan suatau usaha yang berifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik (Schwalbe, 2006:4).

Menurut Husen (2009:4), proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia material, peralatan, dan modal/biaya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sebuah proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Larson, 2006:3).

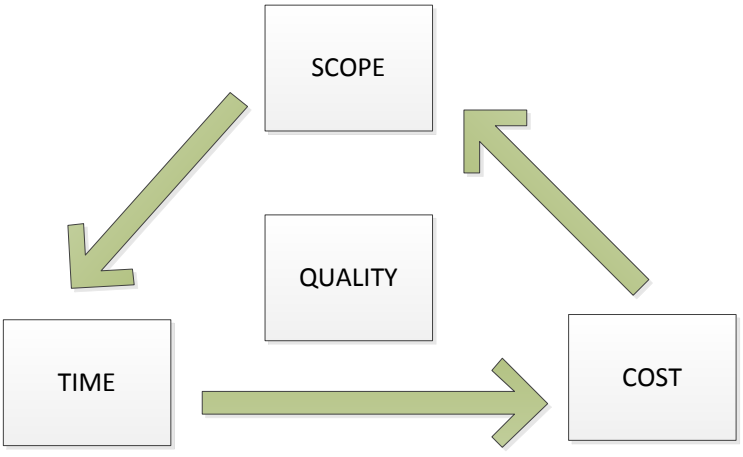

Gambar 2.1 Cakupan Manajemen Proyek

(Sumber: Pengertian Manajemen Proyek Menurut Larson, 2006:3)


Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpukan beberapa pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu dan waktu serta keselamatan kerja (Husen 2009:4). Menurut Ervianto (2005:21), manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.

Jenis proyek menurut Soeharto (1999), dapat dikelompokkan menjadi:

1. Proyek *Engineering*-Konstruksi
   Terdiri dari pengkajian kelayakan, desain *engineering*, pengadaan dan konstruksi.
2. Proyek *Engineering*-Manufaktur
   Dimaksudkan untuk membuat produk baru, meliputi pengembangan produk manufaktur, perakitan, uji coba fungsi dan operasi produk yang dihasilkan.
3. Proyek Penelitian dan Pengembangan
   Bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu.
4. Proyek Pelayanan Manajemen
   Proyek pelayanan manajemen tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik tetapi laporan akhir, misalnya merancang sistem informasi manajemen.
5. Proyek Radio-Telekomunikasi
   Bertujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya minimal.
6. Proyek Konservasi *Bio-Diversity*
   Proyek konservasi *bio-diversity* merupakan proyek yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan.

Kegiatan-kegiatan dalam sebuah proyek berlangsung dari titik awal, kemudian jenis dan intensitas kegiatannya meningkat hingga ke titik puncak, turun dan berakhir

seperti gambar 2.2. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sumber daya berupa jam, orang, dana, material atau peralatan (Soeharto, 1999).

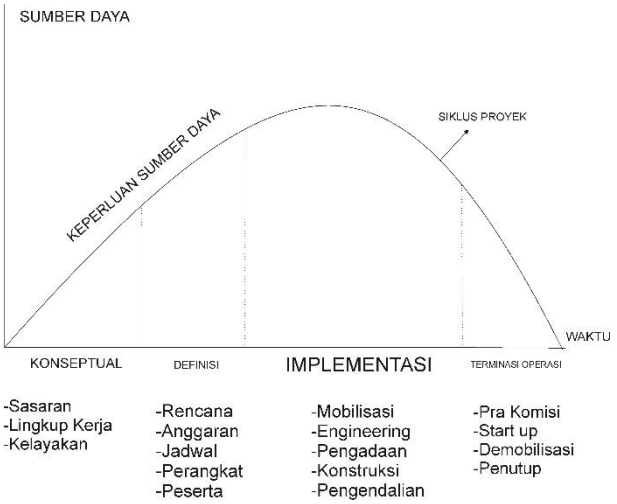

Gambar 2.2 Hubungan Waktu Siklus Proyek

(Sumber: Manajemen Proyek: Dari Konseptual sampai Operasional, 1999)

2.1.2 Keterlambatan Proyek

Kusjadmikahadi (dalam Leonda 2008) bahwa, keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak.

Proboyo (1999), keterlambatan pelaksanaan proyek umumnya selalu menimbulkan akibat yang merugikan bagi pemilik maupun kontraktor karena dampak keterlambatan adalah konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu, dan biaya tambah.

2.1.3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem LPSE ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) saat ini adalah *e-tendering* yang kententuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan kepala LKPP Nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik *(e-Catalogue)* yang merupakan system informasi elektkronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara *online* (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik *(e-Purchasing)*. Secara umum, struktur organisasi LPSE adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3 Struktur LPSE

(Sumber: LPSE 2012: Diambil kembali dari LPSE: https://lpse.lkpp.go.id/eproc/)

2.1.4 Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* - LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit

2.1.5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.

LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.1.6 Tahap LPSE

Setiap penyedia barang dan jasa yang ingin mengikuti paket lelang harus mendaftarkan dulu melalui *website* LPSE http://lpse.wilayah.go.id, dengan cara memasukkan alamat email. Melalui alamat email yang diberikan maka LPSE akan memberikan panduan pendaftaran berikutnya. Setelah terdaftar dan mempunyai *user name* dan *password*, maka pengguna dapat mendaftar mengikuti lelang dengan memilih paket lelang yang ada. Setelah memilih paket lelang maka selanjutnya pengguna tersebut mengunggah/*upload* berkas yang dibutuhkan melalui *website*. Ketika upload data selesai maka tahapan berikutnya yaitu pengguna menyerahkan berkas-berkas ke LPSE untuk dilakukan *verifikasi*.

Menurut web LPSE (2012) terdapat beberapa tahap pelelangan yaitu:

1. Proses Pendaftaran
   - Secara konvensional: wajib hadir secara fisik untuk melakukan proses pendaftaran
   - Secara elektronik: secara *online* melalui *website* LPSE
2. Proses Pengumuman Lelang
   - Secara konvensional: pengumuman lelang diumumkan melalui media massa seperti surat kabar nasional
   - Secara elektronik: Pengumuman lelang yang dilaksanakan secara elektronik akan tampil pada halaman utama LPSE.

3. Dokumen Lelang
   - Secara konvensional: dokumen lelang dalam bentuk *hardcopy*, dan pengambilan dokumen lelang dengan cara peserta lelang datang langsung.
   - Secara elektronik: dokumen lelang dalam bentuk *softcopy*, dan pengambilan dokumen lelang dapat di *download* di *website* LPSE.
4. Penjelasan Dokumen Lelang
   - Secara konvensional: bisa dilakukan melalui tatap muka ke kantor LPSE
   - Secara elektronik: bisa dilakukan secara *online* di *website* LPSE
5. Pemasukan Dokumen Penawaran
   - Secara konvensional: bisa dilakukan melalui tatap muka ke kantor LPSE
   - Secara elektronik: bisa dilakukan secara *online* di *website* LPSE
6. Pembukaan Dokumen Penawaran
   - Secara konvensional: bisa dilakukan melalui tatap muka ke kantor LPSE
   - Secara elektronik: bisa dilakukan secara *online* di *website* LPSE
7. Melakukan Sanggah
   - Secara konvensional: bisa dilakukan melalui tatap muka ke kantor LPSE
   - Secara elektronik: bisa dilakukan secara *online* di *website* LPSE\

2.1.7 Metode *E-Tendering*

Metode *E-Tendering* terdiri dari:

1. E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
2. E-Lelang cepat untuk pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis.
3. E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi.
4. E-Seleksi cepat untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis.

2.1.8 *Judgmental Biases*

Psikologi membedakan antara pertimbangan dengan keputusan. Pertimbangan (*Judgment*) adalah sebuah proses mengevaluasi fakta dan keadaan, dan

memformulasikannya dalam pendapat apakah itu wajar, hanya, akurat, material, atau cukup. *Judgment* dalam hal ini merupakan salah satu dari aspek ergonomi kognitif dalam proses pengambilan keputusan. Riset dalam bidang psikologi menunjukan bahwa *object jugmental* yang diharapkan dari *auditor* dapat hilang akibat ketidakrealistisan *auditess*. Meskipun kesalahan dalam pelaporan audit dapat terjadi dengan sengaja, bias tersebut lebih bersifat suatu kondisi yang terjadi tanpa disadari, tidak disengaja dan merupakan faktor yang tidak dapat terlepas dalam proses pengambilan keputusan. Bias yang terjadi dalam proses audit ini terjadi secara sistematis dan kemudian dikenal dengan *systematic biases in judgmental* (Bazerman, 2001).

Tversky dan Kahneman (1974) menyatakan bahwa menggunakan *representativeness heuristic* dalam membuat keputusan memiliki beberapa akibat, antara lain yaitu bias sampel. Bias sampel diartikan sebagai keterwakilan sampel statistik terhadap parameter populasi tidak tergantung pada ukuran sampel. Kemudian Shefrin (2007) bahwa *representativeness* bias akan mempengaruhi pembentukan keyakinan pada saat menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan. Maksudnya, ketika menerima informasi maka perlu dinalar dengan tepat sehingga terhindar dari *representativeness* bias, namun jika tidak dinalar dengan tepat maka akan menghasilkan keyakinan yang bias.

Maka Bias adalah adalah sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka. Ia juga berarti kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai. Sebuah bias kognitif adalah kesalahan dalam berpikir, menilai, mengingat, atau proses kognitif. Yaitu, sebuah pola penyimpangan dari standar dalam pertimbangan, di mana inferensi bisa terjadi secara tidak wajar. Orang-orang membuat "realitas sosial subjektif" mereka berdasarkan persepsi mereka, pandangan dunia mereka bisa menentukan tingkah laku mereka. Karena itu, bias kognitif bisa menyebabkan penyimpangan persepsi, pertimbangan yang tidak tepat, penafsiran yang tidak logis, atau yang sering disebut keirasionalan. Akan tetapi sebagian bias kognitif bisa dibuat menjadi adaptif, dan bisa menyebabkan keberhasilan dalam situasi yang tepat. Selain itu, bias kognitif bisa membantu memilih pilihan yang lebih cepat ketika kecepatan lebih penting dari ketepatan. Bias kognitif lain adalah "produk sampingan" dari keterbatasan

kemampuan manusia memproses informasi, terjadi karena ketiadaan mekanisme mental yang tepat, atau hanya dari keterbatasan manusia dalam pemprosesan informasi.

2.1.9 *One Sample t-Test*

Hipotesis adalah suatu kalimat atau suatu penyatan yang belum mempunyai nilai benar atau nilai salah, oleh sebab itu, perlu dilakukan pengujian untuk mendapatkan kepastian nilai dari pernyataan tersebut (Siregar, 2013). Dengan menggunakan uji hipotesis, peneliti dapat menguji berbagai teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. Uji hipotesis *t-test* dibagi menjadi tiga, yaitu uji hipotesis rataan satu populasi (*one sample t-test)*, uji hipotesis rataan dua populasi (*independent sample t-test)* dan uji hipotesis data berpasangan (*paired sample t-test*).

One sample t test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pengujian rata-rata satu sampel dimaksudkan untuk menguji nilai tengah atau rata-rata populasi μ sama dengan nilai tertentu μo, lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi μ tidak sama dengan μo. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi.

Dalam perhitungan *One sample T-test* ini mengunakan α =5% dengan hipotesis sebagia berikut:

Ho: $\mu = 0$ = tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata akurasi dengan rata-rata yang di jadikan pembanding yaitu 0


Ha: $\mu \neq 0$ = terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata akurasi dengan rata-rata yang di jadikan pembanding yaitu 0

Kriteria pengujian bias akurasi estimasi *overall project time* dan *activities project time* waktu lelang proyek LPSE:


Jika nilai probabilitas (α) > 0,05 maka H_0 *can't reject* = Tidak Bias

Jika nilai probabilitas (α) ≤ 0,05 makan H_0 *reject* = Bias

Menentukan Besarnya tingkat signifikansi α dilihat pada gambar 2.4 dan gambar 2.5 sebagai berikut:

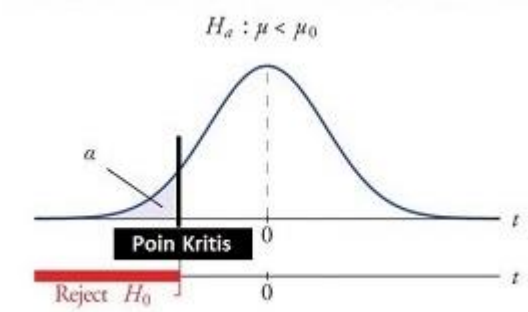

Gambar 2.4 One Tail

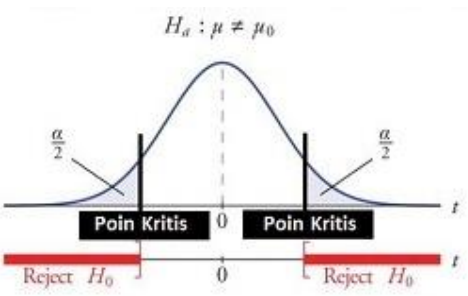

Gambar 2.5 Two Tail

Apabila Zhitung berada di daerah penolakan maka hipotesis (Ho) ditolak. Sebaliknya, apabila Zhitung berada di daeah peneriman maka hipotesis (Ho) diterima.

Rumus *One Sample t-Test*:

$$t_{hit} = \frac{x-\mu_0}{s/\sqrt{n}} \quad \text{..... (2.1)}$$

t = nilai t hitung

$\bar{x}$ = rata-rata sampel

μ_0 = nilai parameter

s = standar deviasi sampel

n = jumlah sampel

2.1.10 *Independent Sample t-Test*

Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi/kelompok data yang independen. Untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Dalam perhitungan manual *independent sample t-test* menggunakan rumus yaitu:

Uji T *independent* ini memiliki asumsi/syarat yang mesti dipenuhi, yaitu:

a. Datanya berdistribusi normal.
b. Kedua kelompok data independen (bebas)

c. variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik (dengan hanya 2 kelompok)

Terdapat 3 jenis rumus yang digunakan dalam melakukan uji hipotesis *Independen sample t-test* ini yaitu:

1. Apabila $\sigma 1$ dan $\sigma 2$ diketahui
2. Apabila $\sigma 1$ dan $\sigma 2$ diketahui dan Varian sama
3. Apabila $\sigma 1$ dan $\sigma 2$ diketahui dan varian tidak sama

Maka dalam melakukan uji *Independent Sample T-test* maka perlu di ketahui dahulu varian dari kedua populasi sample tersebut. Karena terdapat 2 perbedaan rumus dalam perhitungan Uji *Independent Sample T-test* yaitu :

a) Asumsi varian tidak sama
b) Asumsi varian Sama

Maka dalam perhitungannya digunakann rumus :

$$F = \frac{s1^2}{s2^2} \ldots\ldots\ldots\

variabel terikat akan mempunyai garis tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar (saling berpotongan), maka antara faktor tidak mempunyai interaksi.

Tujuan dari uji *anova* satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikansi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan (data sampel dianggap dapat mewakili populasi). *Anova* satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. (Riduwan, 2008).

Anova pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji-t (t_{hitung}). Uji-t atau uji-z hanya dapat melihat perbandingan dua kelompok data saja. Sedangkan *anova* satu jalur lebih dari dua kelompok data. Contoh: Perbedaan prestasi belajar statistika antara mahasiswa tugas belajar (X_1), izin belajar (X_2) dan umum (X_3). *Anova* lebih dikenal dengan uji-F (*Fisher Test*), sedangkan arti variasi atau varian itu asalnya dari pengertian konsep "*Mean Square*" atau kuadrat rerata (KR).

Rumusnya:

$$KR = \frac{JK}{db} \quad \text{..... (2.3)}$$

Dimana: JK = jumlah kuadrat (*some of square*)

db = derajat bebas (*degree of freedom*)

Menghitung nilai *Anova* atau F (F_{hitung}) dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{V_A}{V_D} = \frac{KR_A}{KR_D} = \frac{JK_A : db_A}{JK_D : db_D} = \frac{varian\ antar\ group}{varian\ antar\ group} \quad \text{..... (2.4)}$$

Varian dalam group dapat juga disebut Varian Kesalahan (Varian Galat). Dapat dirumuskan:

$$JK_A = \sum \frac{(\sum X_{Ai})^2}{n_{Ai}} - \frac{(\sum X_\tau)^2}{N} \text{ untuk } db_A = A - 1 \quad \text{.....(2.5)}$$

$$JK_D = (\sum X_\tau)^2 - \sum \frac{(\sum X_{Ai})^2}{n_{Ai}} \text{ untuk } db_D = N - A \quad \text{..... (2.6)}$$

Dimana

$\frac{(\sum X_T)^2}{N}$ = sebagai faktor koreksi…… (2.7)

N = Jumlah keseluruhan sampel (jumlah kasus dalam penelitian).

A = Jumlah keseluruhan group sampel.

2.2 Kajian Induktif

Pada tesis yang berjudul "*Judgmental Biases* Pada Estimasi Durasi Aktivitas Proyek Teknologi Informasi" karya Dwi Handayani (2012) yang membahas tentang fenomena *Jugmental Biases* dalam pengambilan keputusan di Indonesia dengan pokok bahasan manajemen proyek dan dengan responden individu dan kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan metode *survey* dengan responden 30 responden berpengalaman dan 30 orang responden tidak berpengalaman dalam mengestimasi *overall project* proyek IT dengan membandingkan dua metode estimasi, yakni metode *individual interviews* dan *interactive group*. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bias yang sistematis antara estimasi dan kondisi aktual dari opini responden berpengalaman dan responden tidak berpengalaman dalam keputusan individu. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan akurasi antara estimasi responden berpengalaman dan responden tidak berpengalaman, responden berpengalaman terbukti lebih akurat dibandingkan dengan estimasi responden tidak berpengalaman.

Pada karya ilmiah Andrea Caputo (2016) yang berjudul *"overcoming judgmental biases in negotiations: A scenario-based survey analysis on third party direct intervention" jurnal of business research* (2016) membahas tentang kegagalan dalam bernegosiasi bisnis, dimana negosiator gagal untuk mengidentifikasi dan akibatnya memanfaatkan potensi integrative yang mendasari kepentingan dan posisi mereka, karena bias kognitif mencegah pengelolahan informasi yang jelas. Bias seperti itu dapat diatasi melalui intervensi dari pihak luar. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi baru bentuk intervensi eksternal pada negosiasi untuk mengatasi bias kognitif dan mencapai kesepakatan integrative. Penelitian ini pertama berkontribusi untuk memahami tantangan dan solusi untuk mencapai kesepakatan *integrative*; kedua, untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbedaan individu dalam negosiasi; ketiga, untuk mengembangkan

pendekatan metodologi baru untuk mempelajari negosiasi dengan menciptakan dan memvalidasi kasus skenario menggunakan sketsa. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel 5-6 manajer berpengalaman menunjukan bahwa bentuk intervensi peningkatan penciptaan nilai, keadilan dan kemungkinan mencapai persetujuan. Perbedaan individu yang ditemukan dalam hal kepribadian, jenis kelamin, dan pendidikan.

Kemudian pada *paper* Cuneyt Eroglu dan Keely L. Croxton (2010) yang berjudul ”*Biases in judgmental adjustments of statistical forecasts: The role of individual differences*” membahas tentang penyesuaian *judgmental* dari perkiraan *statistic* yang banyak digunakan untuk meningkatkan akurasi perkiraan. Jurnal ini mempertimbangkan tiga jenis bias: (1) Bias optimism, (2) penahan Bias, dan (3) Bias berlebihan. Jurnal ini mengeksplorasi efek dari perbedaan tertentu individu, khususnya kepribadian, orientasi motivasi, dan tempat kerja kendali. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepribadian seorang peramal dan orientasi motivasi memiliki efek signifikan pada bias peramalan, sedangkan pada tempat kerja kendali tidak berpengaruh pada bias peramalan. Analisis dari penelitian ini ingin mengetahui efek dari perbedaan tertentu individu, khususnya kepribadian, orientasi motivasi dan tempat kerja kendali dapat mendorong kemauan seorang peramal untuk menyesuaikan *judgmentally* dari perkiraan *statistic*. Maka penulis menerapkan *Judgmental Biases* dengan bantuan dari analisis perbandingan uji *statistic* menggunakan SPSS agar tidak terjadi bias dalam pengambilan keputusan suatu proyek dan menjadikan suatu keputusan yang lebih akurat.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada seluruh regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya dari setiap Kabupaten akan dijadikan sebagai perbandingan.

3.2 Jenis Data

Pada penelitian ini data yang diperlukan adalah berupa data primer dan data sekunder:

1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber, yaitu berupa data umum lembaga meliputi sejarah berdirinya lembaga, serta informasi yang berhubungan dengan penelitian.

2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yakin dari masing-masing region berupa data waktu estimasi prediksi dan waktu aktual pengadaan lelang per kegiatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan agar dapat membantu dalam penelitian maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

   Metode pengumpulan data dengan penelitian langsung di lokasi, dalam hal ini adalah LPSE yang ada di regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan cara mengamati secara langsung bagaimana keadaan dan kegiatan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Studi Pustaka

   Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka yaitu dengan mengambil informasi dari buku atau literatur yang membahas permasalahan yang sama dengan yang diteliti.

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan model matematis yang sesuai dengan metode yang akan digunakan. Setelah itu dilakukan pengolahan data, yang kemudian dianalisis hasilnya dalam bentuk kesimpulan dari penelitian ini.

3.4.1 Teknik Pengolahan Data

Pada bagian teknik pengolahan dan analisis data, akan menjelaskan secara singkat dari tahapan dalam penerapan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengolahan data:

1. Melakukan observasi bias estimasi dengan kondisi aktualnya pada lembaga.
2. Melakukan perbandingan dengan uji statistic menggunakan *software* SPSS.
3. Melakukan uji pola distribusi menggunakan *software* Promodel.

3.4.2 Analisis Hasil

Tahap analisa hasil ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap dari penelitian yang telah dilakukan, yang secara spesifik mengarah kepada analisis implementasi sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

3.4.3 Kesimpulan dan Saran

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menyimpulkan permasalahan yang telah diselesaikan, setelah dilakukan analisis permasalahan yang dipecahkan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk merangkum hasil akhir dari penelitian. Sedangkan saran diberian untuk memberikan masukan kepada pihak lembaga untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

3.5 Perancangan Penelitian

Pada dasarnya, metodologi penelitian yang dilakukan peneliti dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan, dan tahap pengolahan data, serta tahap analisa dan kesimpulan.

1. Tahap Persiapan

   Tahap ini merupakan tahap awal dengan mengumpulkan informasi, permasalahan yang terjadi, dan membentuk sebuah tujuan dari tujuan penelitian ini.

2. Identifikasi Masalah

   Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi maka tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan apa yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian. Permasalahan tersebut dirangkum dan dibentuk menjadi dasar untuk menggunakan suatu metode untuk menyelesaiannya

3. Studi Lapangan

   Penelitian kali ini dilakukan di LPSE yang ada di regional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meninjau lokasi dari penelitian secara langsung. Peneliti melakukan observasi secara langsung guna mencari permasalahan yang ada di lapangan dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

4. Studi Literatur

   Setelah melakukan studi lapangan dan melakukan observasi secara langsung maka akan menemuan permasalahan yang ada di lembaga. Dengan menggunakan jurnal, buku, atau sumber lainnya penulis mencari penyelesaian paling tepat dari permasalahan yang dihadapi dari literatur-literatur yang ada. Dengan menggunakan literatur penulis juga dapat melakukan pembandingan dengan permasalahan yang sama dari literatur tersebut.


5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

   Setelah mencari literatur dan metode penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi di lapangan maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan penelitian lapangan secara langsung kepada objek atau jika diperlukan dapat dengan mengguanakan pengamatan. Setelah data yang dibutuhkan dirasa cukup maka selanjutnya yaitu pengolahan data.

6. Analisa dan Kesimpulan Data

   Setelah dilakukan pengolahan data maka tahap terakhir yaitu adalah melakukan analisa dari data yang sudah diolah. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

3.6 Alur Penelitian

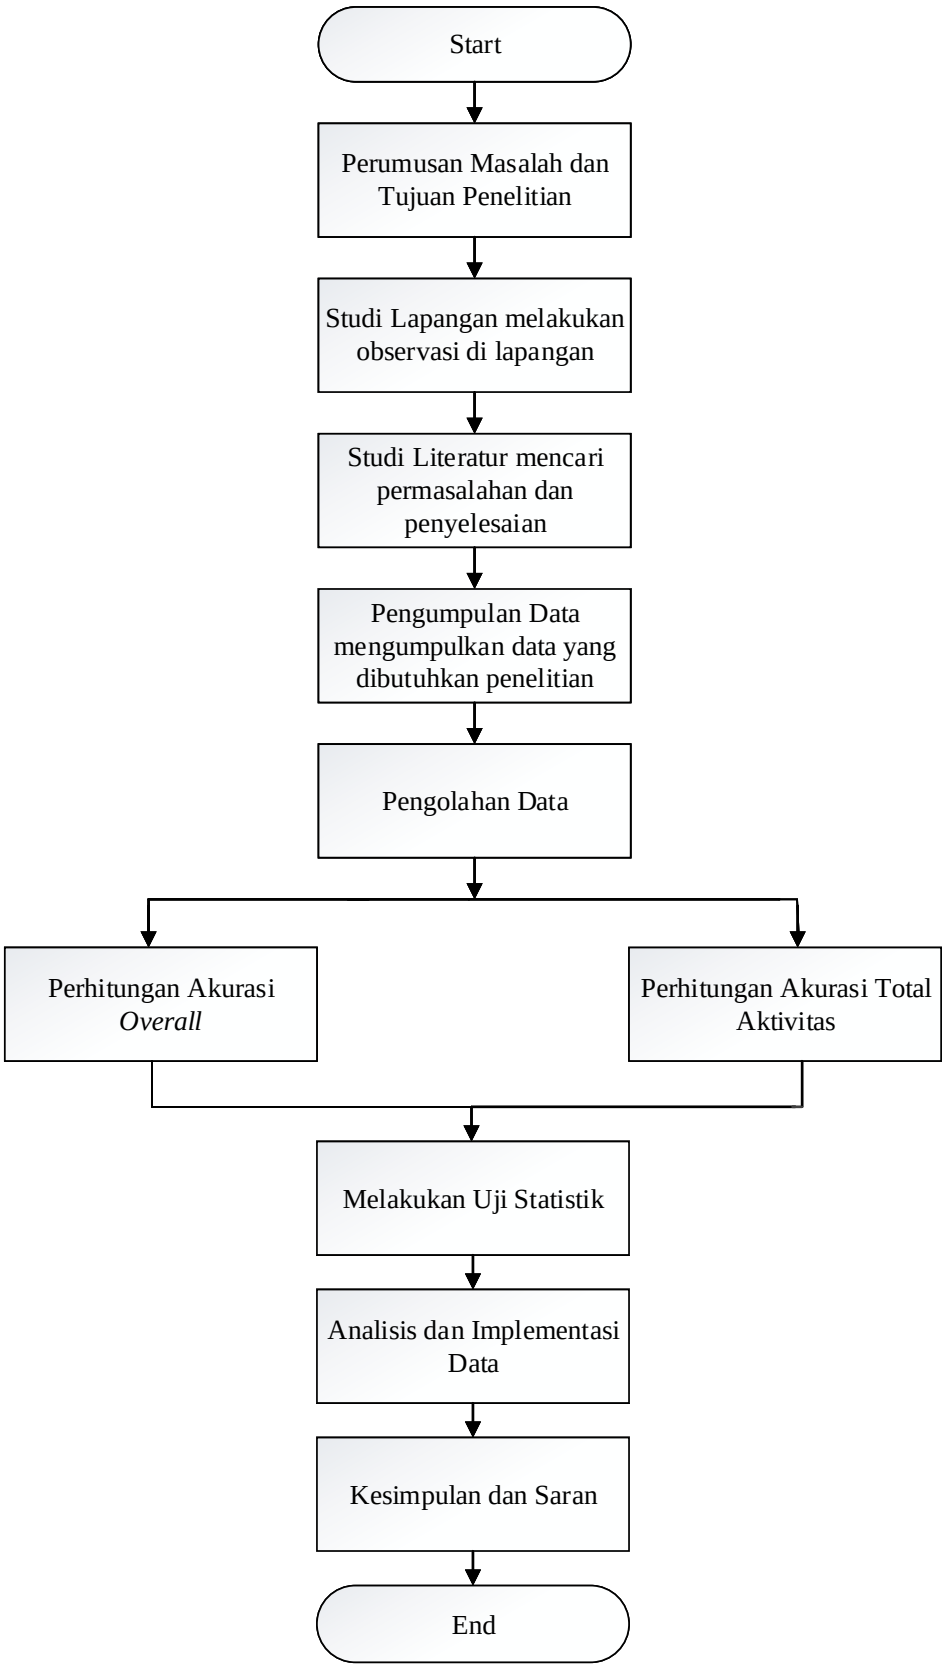

Gambar 3.1 *Flowchart* Penelitian

3.7 Hasil Penelitian

Setelah melakukan perancangan penelitian maka dari penelitian ini diharakan dapat memperoleh hasil yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Selain itu dapat memeberikan saran kepada lembaga untuk mengurangi fenomena *judgmental biases* dalam pengambilan keputusan suatu proyek.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pengumpulan Data

Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data LPSE yang bertempatan pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki 14 aktivitas dari masing-masing proyeknya. Pengumpulan data dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 30 April 2017. Beriku adalah 14 tahapan LPSE wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dijabarkan pada table 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Tahapan Lelang LPSE

No	Tahap
1	Pengumuman Pascakualifikasi
2	Download Dokumen Pengadaan
3	Pemberian Penjelasan
4	Upload Dokumen Penawaran
5	Pembukaan Dokumen Penawaran
6	Evaluasi penawaran
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi
8	Pembuktian Kualifikasi
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
10	Penetapan pemenang
11	Pengumuman Pemenang
12	Masa Sanggah Hasil Lelang
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
14	Penandatanganan Kontrak

Jumlah proyek yang didapat dari LPSE wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memiliki 14 tahapan dan batasan pengumpulan data dari mulai bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017 terdapat 64 data yang akan di jabarkan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Jumlah Proyek Per Wilayah

Lokasi	Jumlah Proyek
Provinsi Yogyakarta	20
Yogyakarta	26
Kulon Progo	10
Gunung Kidul	3


Tabel 4.2 Jumlah Proyek Per Wilayah (Lanjutan)

Lokasi	Jumlah Proyek
Sleman	3
Bantul	2

Provinsi Yogyakarta memiliki 4 kabupaten kota tetapi hanya 3 diantaranya yang memiliki proyek pada bulan januari 2017 hingga bulan maret 2017, selain hanya 3 kota tedapat 1 ibu kota provinsi yaitu kota Yogyakarta.

4.2 Karakteristik Proyek Lelang Pada LPSE

Proyek lelang dalam LPSE pada dasarnya memiliki metode pengadaan yang berbeda-beda yaitu e-Lelang sederhana, e-Lelang pemilihan langsung, dan e-Lelang umum yang akan dijabarkan melalui diagram dibawah ini:

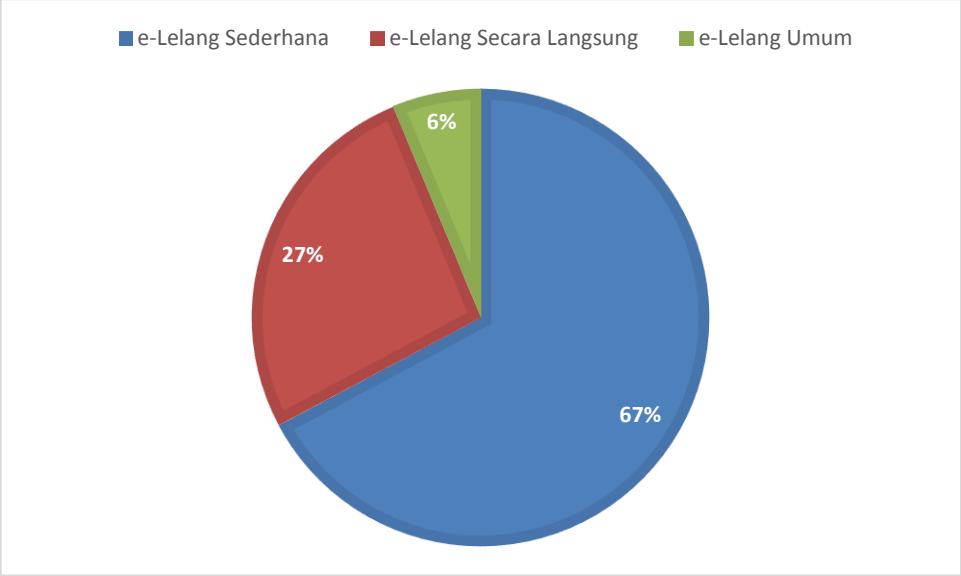

Gambar 4.1 Diagram Karakteristik Proyek LPSE

Dari diagram merupakan diagram metode lelang pada wilayah Yogyakarta terdiri dari 3 metode yaitu e-Lelang Sederhana sebesar 67%, kemudian untuk e-Lelang Secara Langsung yaitu 37%, dan yang terakhir adalah e-Lelang Umum yaitu sebesar 6%.

4.3 Data Waktu Lelang Proyek LPSE pada Wilayah Provinsin Yogyakarta

Dalam Penelitian ini terdapat 64 proyek dari seluruh wilayah yang telah di rekap kedalam table, berikut merupakan tabel data proyek dari nama proyek, durasi perkiraan lelang keseluruhan, durasi perkiraan lelang seluruh aktivitasnya dan harga penawaran sendiri:

Tabel 4.3 Data Profil Provinsi Yogyakarta

No	Nama Proyek	Durasi *Overall* Prediksi	Durasi *Activity* Prediksi	Nilai HPS
1	Pembangunan gedung kantor	34	58	Rp6.957.913.000,00
2	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23	43	Rp258.640.000,00
3	Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Menjahit, Pelatihan Bordir, Pelatihan Salon Kecantikan di BLKPP DIY	22	43	Rp552.850.000,00
4	Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele, Nila, Gurami, Minapadi, Ugadi dan Ikan Hias	23	52	Rp2.327.564.500,00
5	Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, taman, dan halaman kantor BPK Perwakilan DIY	19	37	Rp518.430.000,00
6	Belanja Cetak	21	55	Rp333.778.500,00
7	Belanja Bahan Kimia Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah	27	53	Rp349.918.700,00
8	Rehab Bangsal Pemijahan ,Hatchery, Saluran Pembuangan Air dan Bak Karantina Ikan, BAT Cangkringan	29	55	Rp2.679.936.000,00
9	Pengadaan Pakaian Jawa/Karawitan Untuk Desa/ Kaluran Budaya	30	58	Rp415.844.000,00
10	Belanja Bahan Pakan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak	24	40	Rp2.466.423.000,00
11	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	23	49	Rp431.314.000,00
12	Pengadaan Pakaian Seni	25	56	Rp874.995.000,00
13	Belanja Bahan Kimia - IPLT	28	56	Rp406.425.000,00
14	Konstruksi Rehabilitasi Dalem Suryowijayan	29	45	Rp3.071.945.685,00

Tabel 4.3 Data Profil Provinsi Yogyakarta (Lanjutan)

No	Nama Proyek	Durasi Overall Prediksi	Durasi Activity Prediksi	Nilai HPS
15	Pengadaan alat lab kimia - SPAM	25	55	Rp1.942.500.000,00
16	Pengadaan Bahan Kimia / Reagensia	29	58	Rp2.366.185.596,00
17	Rehabilitasi Hatchery Lele, beserta kelengkapannya BAT Bejiharjo	28	59	Rp1.534.673.554,48
18	Pengadaan Obat-obatan non e-katalog	23	42	Rp499.823.200,00
19	Pengadaan Barang Pupuk NPK dan Pupuk Organik	23	44	Rp605.665.500,00
20	Belanja Alat - alat / Perlengkapan PAB BPO	18	43	Rp333.196.050,00

Tabel 4.4 Data Profil Kabupaten Bantul

No	Nama Proyek	Durasi *Overall* Prediksi	Durasi *Activity* Prediksi	Nilai HPS
1	Belanja Cetak Blangko Security	30	49	Rp572.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan Jaringan Internet dan Intranet	25	43	Rp405.118.000,00

Tabel 4.5 Data Profil Kabupaten Sleman

No	Nama Proyek	Durasi *Overall* Prediksi	Durasi *Activity* Prediksi	Nilai HPS
1	Pengadaan 1 (Satu) Unit Lift Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iv Yogyakarta	24	55	Rp629.580.000,00
2	Bahan Pemugaran Candi Perwara Deret II No. 35 Kompleks Candi Prambanan	21	62	Rp897.096.000,00
3	Bahan Pemugaran Pagar Teras VIII Kompleks Candi Ijo	22	59	Rp293.200.000,00

Tabel 4.6 Data Profil Kabupaten Kulon Progo

No	Nama Proyek	Durasi *Overall* Prediksi	Durasi *Activity* Prediksi	Nilai HPS
1	Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Rawit	26	78	Rp921.885.000,00
2	Pengadaan Sarana Produksi Cabe Besar (Merah Keriting) Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Besar	26	78	Rp1.390.087.500,00
3	Relokasi Pasar Bendungan	29	56	Rp1.250.000.000,00
4	Belanja Langganan FIber Optik Backhaul, Belanja Langganan Fiber Optik Cabang dan Biaya Instalasi/Aktivasi	26	64	Rp554.315.000,00
5	abilitasi Jembatan Munggangwetan	26	67	Rp489.668.000,00
6	Rehabilitasi Jembatan Kaliduren	26	67	Rp579.071.000,00
7	Rehabilitasi Jembatan Trayu cs	26	67	Rp742.174.000,00
8	Rehabilitasi Jembatan Kalibuko	26	67	Rp674.300.000,00
9	Rehabilitasi Jembatan Brangkal	26	67	Rp581.777.000,00
10	Peningkatan Jalan BD. Demangrejo - Karangasem (119)	39	79	Rp922.085.000,00

Tabel 4.7 Data Profil Kabupaten Gunung Kidul

No	Nama Proyek	Durasi *Overall* Prediksi	Durasi *Activity* Prediksi	Nilai HPS
1	Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Mina Padi (DAK 2017)	27	52	Rp359.800.000,00
2	Pengadaan cabai besar Fasilitasi bantuan kepada petani cabai besar	30	65	Rp1.270.722.000,00
3	Pengadaan bibit bawang merah Fasilitasi Bantuan kepada petania bawang merah	30	65	Rp1.998.000.000,00

Tabel 4.8 Data Profil Kota Yogyakarta

No	Nama Proyek	Durasi *Overall* Prediksi	Durasi *Activity* Prediksi	Nilai HPS
1	Penataan pertamanan halaman Selatan Gedung Induk di Istana Kepresidenan Yogyakarta	17	39	Rp382.030.000,00
2	Renovasi Balai RW 8,9,10 Semaki	22	67	Rp799.999.953,69
3	Belanja Jasa Keamanan RS Pratama	19	48	Rp261.724.125,00
4	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Malioboro (11 bln)	18	51	Rp333.043.000,00
5	Pembangunan Ruang Produksi Audio/Vidio LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta	43	86	Rp1.985.000.000,00
6	Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Prajabatan Pola Transisi Gol III (IPDN Yogyakarta)	11	29	Rp1.337.600.000,00
7	Pembangunan SAH Jl. Danurejan	22	53	Rp584.926.143,25
8	Pembangunan SAH Jl. Suryodiningratan	28	54	Rp1.599.892.401,25
9	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Kec. MJ	22	60	Rp488.298.562,72
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Komputer Kebutuhan F MIPA	43	77	Rp252.525.003,50
11	Pengadaan dan Pemasangan Gordyn Gedung Induk	22	41	Rp472.505.000,00
12	Peningkatan Jembatan Karangrejo	22	52	Rp3.198.836.430,67
13	Perbaikan Gapura Batas Kota Jalan Solo	22	53	Rp469.532.648,65
14	Belanja Barang Berupa Jas Almamater dan Kaos Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017	29	76	Rp708.275.000,00
15	Peningkatan Jalan Veteran (DAK)	28	57	Rp4.142.519.340,52
16	Pengendalian Kawasan Alun-Alun Utara	19	50	Rp963.809.000,00
17	Pengendalian Kawasan Titik Nol Kilometer	19	50	Rp1.122.305.000,00
18	Bahan Film dan Pengolah Film Badge	26	31	Rp836.790.000,00
19	Pengamanan Komplek Balaikota	19	50	Rp1.738.518.000,00

Tabel 4.8 Data Profil Kota Yogyakarta (Lanjutan)

No	Nama Proyek	Durasi Overall Prediksi	Durasi Activity Prediksi	Nilai HPS
20	Belanja Jasa Keamanan Satpam (Security) Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	20	55	Rp315.783.000,00
21	Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Kraton (11 bulan)	20	51	Rp931.523.000,00
22	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Tungkak (11 bln)	19	48	Rp381.350.000,00
23	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Kotagede (11 bln)	19	51	Rp365.047.000,00
24	Pemeliharaan Pohon Perindang Tepi Jalan (tinggi < 9 m, 1.260 batang) (11 bulan)	20	51	Rp221.266.000,00
25	Jaket Almamater UPN	24	51	Rp562.375.000,00
26	Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Malioboro (11 bulan)	20	51	Rp1.297.092.000,00

Data diatas merupakan data profil LPSE yang terdapat pada region Yogyakarta. Dengan total proyek sebnyak 64 proyek, dimana terdapat 6 wilayah diantaranya yaitu Provinsi Yogyakarta memiliki 20 proyek, Kabupaten Sleman memiliki 3 proyek, Kabupaten Bantul memiliki 2 proyek , Kabupaten Kulon Progo memiliki 10 proyek, Kabupaten Gunung Kidul memiliki 3 proyek dan Kota Yogyakarta memiliki 26 proyek. Sedangkan pada Kabupaten Bantul tidak dimasukan kedalam perhitungan nanti karena memiliki sampel yang sedikit.

4.4 Perhitungan Akurasi Estimasi Waktu Lelang Proyek

Poin pertama yang diobservasi dalam penielitian ini adalah menghitung akurasi estimasi waktu lelang proyek. Menurut Handayani (2012), terdapat 2 perhitungan akurasi yaitu akurasi *overall time* dan akurasi *activities time*. Definisi estimasi *overall time* adalah estimasi waktu pengerjaan satu proyek secara keseluruhan tanpa melakukan *breakdown* masing-masing aktivitasnya. Sedangkan estmasi *activities* time adalah jumlah dari

estimasi-estimasi waktu aktivitas yang telah di *breakdown* yang terdapat dalam sebuah proyek.

4.4.1 Perhitungan Akurasi Estimasi *Overall Project Time*

Akursi estimasi *Overall time* lelang secara matematis dapat di nyatakan sebagai berikut:

Akurasi estimasi *overall project time* = Estimasi *overall time* – Waktu aktual

Sehingga dari perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perhitungan Akurasi *Overall* Provinsi Yogyakarta

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Pembangunan gedung kantor	34	34	0
2	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23	40	-17
3	Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Menjahit, Pelatihan Bordir, Pelatihan Salon Kecantikan di BLKPP DIY	22	22	0
4	Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele, Nila, Gurami, Minapadi, Ugadi dan Ikan Hias	23	23	0
5	Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, taman, dan halaman kantor BPK Perwakilan DIY	19	19	0
6	Belanja Cetak	21	21	0
7	Belanja Bahan Kimia Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah	27	27	0
8	Rehab Bangsal Pemijahan ,Hatchery, Saluran Pembuangan Air dan Bak Karantina Ikan, BAT Cangkringan	29	29	0
9	Pengadaan Pakaian Jawa/Karawitan Untuk Desa/ Kaluran Budaya	30	30	0
10	Belanja Bahan Pakan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak	24	24	0
11	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	23	23	0
12	Pengadaan Pakaian Seni	25	25	0
13	Belanja Bahan Kimia - IPLT	28	28	0
14	Konstruksi Rehabilitasi Dalem Suryowijayan	29	37	8
15	Pengadaan alat lab kimia - SPAM	25	25	0
16	Pengadaan Bahan Kimia / Reagensia	29	29	0
17	Rehabilitasi Hatchery Lele, beserta kelengkapannya BAT Bejiharjo	28	32	-4
18	Pengadaan Obat-obatan non e-katalog	23	30	-7

Tabel 4.9 Perhitungan Akurasi *Overall* Provinsi Yogyakarta (Lanjutan)

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
19	Pengadaan Barang Pupuk NPK dan Pupuk Organik	23	27	-4
20	Belanja Alat - alat / Perlengkapan PAB BPO	18	18	0

Tabel 4.10 Perhitungan Akurasi *Overall* Kabupaten Sleman

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Pengadaan 1 (Satu) Unit Lift Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iv Yogyakarta	24	24	0
2	Bahan Pemugaran Candi Perwara Deret II No. 35 Kompleks Candi Prambanan	21	23	-2
3	Bahan Pemugaran Pagar Teras VIII Kompleks Candi Ijo	22	22	0

Tabel 4.11 Perhitungan Akurasi *Overall* Kabupaten Kulon Progo

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Rawit	26	29	-3
2	Pengadaan Sarana Produksi Cabe Besar (Merah Keriting) Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Besar	26	26	0
3	Relokasi Pasar Bendungan	29	29	0
4	Belanja Langganan FIber Optik Backhaul, Belanja Langganan Fiber Optik Cabang dan Biaya Instalasi/Aktivasi	26	26	0
5	abilitasi Jembatan Munggangwetan	26	26	0
6	Rehabilitasi Jembatan Kaliduren	26	26	0
7	Rehabilitasi Jembatan Trayu cs	26	26	0
8	Rehabilitasi Jembatan Kalibuko	26	26	0
9	Rehabilitasi Jembatan Brangkal	26	26	0
10	Peningkatan Jalan BD. Demangrejo - Karangasem (119)	39	39	0

Tabel 4.12 Perhitungan Akurasi *Overall* Kabupaten Gunung Kidul

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Mina Padi (DAK 2017)	27	27	0
2	Pengadaan cabai besar Fasilitasi bantuan kepada petani cabai besar	30	30	0
3	Pengadaan bibit bawang merah Fasilitasi Bantuan kepada petania bawang merah	30	30	0

Tabel 4.13 Perhitungan Akurasi *Overall* Kota Yogyakarta

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Penataan pertamanan halaman Selatan Gedung Induk di Istana Kepresidenan Yogyakarta	17	17	0
2	Renovasi Balai RW 8,9,10 Semaki	22	22	0
3	Belanja Jasa Keamanan RS Pratama	19	18	1
4	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Malioboro (11 bln)	18	18	0
5	Pembangunan Ruang Produksi Audio/Vidio LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta	43	43	0
6	Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Prajabatan Pola Transisi Gol III (IPDN Yogyakarta)	11	21	-10
7	Pembangunan SAH Jl. Danurejan	22	22	0
8	Pembangunan SAH Jl. Suryodiningratan	28	23	5
9	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Kec. MJ	22	22	0
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Komputer Kebutuhan F MIPA	43	43	0
11	Pengadaan dan Pemasangan Gordyn Gedung Induk	22	22	0
12	Peningkatan Jembatan Karangrejo	22	22	0
13	Perbaikan Gapura Batas Kota Jalan Solo	22	22	0
14	Belanja Barang Berupa Jas Almamater dan Kaos Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017	29	29	0
15	Peningkatan Jalan Veteran (DAK)	28	28	0
16	Pengendalian Kawasan Alun-Alun Utara	19	19	0
17	Pengendalian Kawasan Titik Nol Kilometer	19	19	0
18	Bahan Film dan Pengolah Film Badge	26	26	0
19	Pengamanan Komplek Balaikota	19	19	0
20	Belanja Jasa Keamanan Satpam (Security) Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	20	20	0
21	Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Kraton (11 bulan)	20	20	0

Tabel 4.13 Perhitungan Akurasi *Overall* Kota Yogyakarta (Lanjutan)

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
22	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Tungkak (11 bln)	19	20	-1
23	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Kotagede (11 bln)	19	20	-1
24	Pemeliharaan Pohon Perindang Tepi Jalan (tinggi < 9 m, 1.260 batang) (11 bulan)	20	20	0
25	Jaket Almamater UPN	24	24	0
26	Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Malioboro (11 bulan)	20	20	0

Dari keseluruhan data *overall* terjadi 2 bias, yaitu bias positif dan bias negatif. Pada data yang memiliki nilai akurasi *minus* adalah bias negatif dimana waktu durasi *overall* aktualnya lebih besar dari pada waktu durasi *overall* prediksi sehingga menghasilkan keterlambatan waktu keseluruh lelang. Dalam hal ini data yang manandakan bias positif tidak dipakai dalam perhitungan bias akurasi nanti karena peneliti hanya mengkaji bias yang terjadi pada keterlambatan proyek. Dari hasil perhitungan akurasi diatas terdapat 2 bias positif yang terjadi pada kota Yogyakarta.

4.4.2 Perhitungan Akurasi Estimasi Total *Activities Project Time*

Akursi estimasi *activities time* lelang secara matematis dapat di nyatakan sebagai berikut:
Akurasi estimasi *activities project time* = Estimasi *activities time* – Waktu aktual

Sehingga dari perhitungan tersebut didapatkan data akurasi *activities time* dari tiap-tiap wilayah di dalam sebagai berikut:

Tabel 4.14 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Provinsi Yogyakarta

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Pembangunan gedung kantor	58	58	0
2	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43	61	-18

Tabel 4.14 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Provinsi Yogyakarta (Lanjutan)

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
3	Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Menjahit, Pelatihan Bordir, Pelatihan Salon Kecantikan di BLKPP DIY	43	43	0
4	Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele, Nila, Gurami, Minapadi, Ugadi dan Ikan Hias	52	52	0
5	Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, taman, dan halaman kantor BPK Perwakilan DIY	37	37	0
6	Belanja Cetak	55	55	0
7	Belanja Bahan Kimia Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah	53	62	-9
8	Rehab Bangsal Pemijahan ,Hatchery, Saluran Pembuangan Air dan Bak Karantina Ikan, BAT Cangkringan	55	62	-7
9	Pengadaan Pakaian Jawa/Karawitan Untuk Desa/ Kaluran Budaya	58	59	-1
10	Belanja Bahan Pakan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak	40	40	0
11	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	49	49	0
12	Pengadaan Pakaian Seni	56	56	0
13	Belanja Bahan Kimia - IPLT	56	64	-8
14	Konstruksi Rehabilitasi Dalem Suryowijayan	45	61	-16
15	Pengadaan alat lab kimia - SPAM	55	55	0
16	Pengadaan Bahan Kimia / Reagensia	58	64	-6
17	Rehabilitasi Hatchery Lele, beserta kelengkapannya BAT Bejiharjo	59	80	-21
18	Pengadaan Obat-obatan non e-katalog	42	41	1
19	Pengadaan Barang Pupuk NPK dan Pupuk Organik	44	47	-3
20	Belanja Alat-alat / Perlengkapan PAB BPO	43	43	0

Tabel 4.15 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kabupaten Sleman

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Pengadaan 1 (Satu) Unit Lift Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iv Yogyakarta	55	55	0
2	Bahan Pemugaran Candi Perwara Deret II No. 35 Kompleks Candi Prambanan	62	68	-6
3	Bahan Pemugaran Pagar Teras VIII Kompleks Candi Ijo	59	59	0

Tabel 4.16 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kulon Progo

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Rawit	78	67	11
2	Pengadaan Sarana Produksi Cabe Besar (Merah Keriting) Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Besar	78	78	0
3	Relokasi Pasar Bendungan	56	56	0
4	Belanja Langganan FIber Optik Backhaul, Belanja Langganan Fiber Optik Cabang dan Biaya Instalasi/Aktivasi	64	64	0
5	abilitasi Jembatan Munggangwetan	67	67	0
6	Rehabilitasi Jembatan Kaliduren	67	67	0
7	Rehabilitasi Jembatan Trayu cs	67	67	0
8	Rehabilitasi Jembatan Kalibuko	67	67	0
9	Rehabilitasi Jembatan Brangkal	67	67	0
10	Peningkatan Jalan BD. Demangrejo - Karangasem (119)	79	79	0

Tabel 4.17 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Gunung Kidul

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Mina Padi (DAK 2017)	52	52	0
2	Pengadaan cabai besar Fasilitasi bantuan kepada petani cabai besar	65	80	-15
3	Pengadaan bibit bawang merah Fasilitasi Bantuan kepada petania bawang merah	65	80	-15

Tabel 4.18 Perhitungan Akurasi Total Aktivitas Kota Yogyakarta

No	Proyek	Durasi Prediksi	Durasi Prediksi	Bias
1	Penataan pertamanan halaman Selatan Gedung Induk di Istana Kepresidenan Yogyakarta	39	39	0
2	Renovasi Balai RW 8,9,10 Semaki	67	61	6
3	Belanja Jasa Keamanan RS Pratama	48	46	2
4	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Malioboro (11 bln)	51	47	4
5	Pembangunan Ruang Produksi Audio/Vidio LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta	86	86	0
6	Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Prajabatan Pola Transisi Gol III (IPDN Yogyakarta)	29	43	-14
7	Pembangunan SAH Jl. Danurejan	53	62	-9
8	Pembangunan SAH Jl. Suryodiningratan	54	54	0
9	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Kec. MJ	60	60	0
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Komputer Kebutuhan F MIPA	77	77	0
11	Pengadaan dan Pemasangan Gordyn Gedung Induk	41	41	0
12	Peningkatan Jembatan Karangrejo	52	52	0
13	Perbaikan Gapura Batas Kota Jalan Solo	53	71	-18
14	Belanja Barang Berupa Jas Almamater dan Kaos Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017	76	70	6
15	Peningkatan Jalan Veteran (DAK)	57	58	-1
16	Pengendalian Kawasan Alun-Alun Utara	50	50	0
17	Pengendalian Kawasan Titik Nol Kilometer	50	50	0
18	Bahan Film dan Pengolah Film Badge	31	31	0
19	Pengamanan Komplek Balaikota	50	50	0
20	Belanja Jasa Keamanan Satpam (Security) Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	55	51	4
21	Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Kraton (11 bulan)	51	42	9
22	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Tungkak (11 bln)	48	59	-11
23	Jasa Pembersihan Jalan Sektor Kotagede (11 bln)	51	59	-8
24	Pemeliharaan Pohon Perindang Tepi Jalan (tinggi < 9 m, 1.260 batang) (11 bulan)	51	51	0
25	Jaket Almamater UPN	51	51	0
26	Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Malioboro (11 bulan)	51	51	0

Dari keseluruhan data *activity* terjadi 2 bias, yaitu bias negatif dan bias positif. Pada data yang memiliki nilai akurasi *minus* adalah bias negatif dimana waktu durasi aktivitas aktualnya lebih besar dari pada waktu durasi aktivitas prediksi sehingga menghasilkan keterlambatan waktu aktivitas tahapan lelang. Dalam hal ini data yang manandakan bias positif tidak dipakai dalam perhitungan bias akurasi nanti karena peneliti hanya mengkaji bias yang terjadi pada keterlambatan proyek. Dari hasil perhitungan akurasi diatas terdapat 8 bias positif yang terjadi yaitu pada Provinsi Yogyakarta sebnyak 1 data, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1 data, dan pada kota Yogyakarta sebanyak 6 data.

4.5 Analisis Bias Akurasi Estimasi Waktu Lelang Proyek

Poin kedua yang diobservasi dalam penelitian ini adalah anilisis bias dalam melakukan estimasi waktu pengerjaan proyek LPSE. Terdapat dua set data estimasi waktu yang digunakan dalam anilisis ini yaitu *overall time* dan estimasi *activites time*.

Untuk melakuka analisis bias akurasi ini menggunakan uji hipotesis mean sampel tunggal. Dalam perhitungan *One sample T-test* ini mengunakan α =5% dengan hipotesis sebagia berikut:

Ho: $\mu = 0$ = tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata akurasi dengan rata-rata yang di jadikan pembanding yaitu 0


Ha: $\mu \neq 0$ = terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata akurasi dengan rata-rata yang di jadikan pembanding yaitu 0

Kriteria pengujian bias akurasi estimasi *overall project time* dan *activities project time* waktu lelang proyek LPSE:

Jika nilai probabilitas (α) > 0,05 maka H_0 *can't reject* = Tidak Bias

Jika nilai probabilitas (α) ≤ 0,05 makan H_0 *reject* = Bias

Menentukan Besarnya tingkat signifikansi α dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

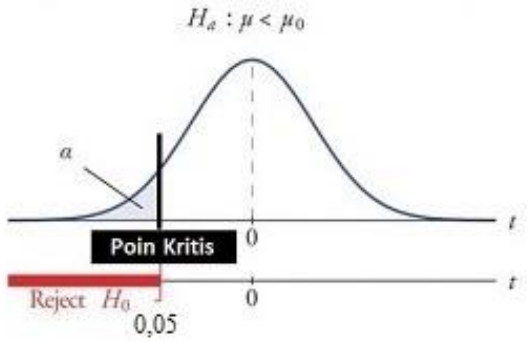

Gambar 4.2 *One Tail* tingkat signifikansi α

Dalam penelitian ini, perhitungan bias akurasi estimasi dilakukan dengan *software* SPSS 18 dengan fungsi *analyze* kemudian pilih *compare mean* dan pilihlah *one sample t-test*, Maka di dapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.19 Ringkasan Uji Hipotesis Akurasi Estimasi *Overall*

No	Keterangan	N	*Mean*	*Std. Deviation*	df	Sig. (2-*tailed*)	Interpretasi
1	Akurasi_*Overall*_Provinsi_Yogyakarta	20	2,0000	4,31643	19	,052	Tidak Bias
2	Akurasi_*Overall*_Sleman	3	,6667	1,15470	2	,423	Tidak Bias
3	Akurasi_*Overall*_Kulon_Progo	10	,3000	,94868	9	,343	Tidak Bias
4	Akurasi_*Overall*_Gunung Kidul	3	,0000	,00000	2	-	Tidak Bias
5	Akurasi_*Overall*_Kota_Yogyakarta	24	,5000	2,04302	23	,243	Tidak Bias
6	Akurasi_*Overall*_Wilayah Kota	40	,4250	1,66237	39	,114	Tidak Bias
7	Akurasi_*Overall*_Seluruh_Wilayah	60	,9500	2,89608	59	,014	Bias

Tabel 4.19 menunjukan nilai sig. (2-*tailed*) dari hasil perhitungan SPSS tiap masing-masing daerah, pada Provinsi Yogyakarta memiliki nilai sig. (2-*tailed*)>0,05 yaitu 0,052 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi *overall* Provinsi Yogyakarta tidak teradi bias, pada Kabupaten Sleman memiliki nilai sig. (2-*tailed*)>0,05 yaitu 0,423 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi *overall* Kabupaten Sleman tidak teradi bias, pada Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai sig. (2-tailed)>0,05 yaitu 0,343 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi *overall* Kabupaten Kulon Progo tidak teradi bias, pada

Kabupaten Gunung Kidul memiliki nilai *Mean* 0 dan *Std.Deviation* sebesar 0 itu menandakan bahwa estimasi akurasi proyek sesuai prediksi, dengan *Std.Deviation* yang konstan maka H_0 *can't reject*, pada kota Yogyakarta memiliki nilai sig. (2-*tailed*)>0,05 yaitu 0,243 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi *overall* kota yogyakarta tidak teradi bias, pada gabungan kota pada memiliki nilai sig. (2-*tailed*)>0,05 yaitu 0,114 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi *overall* gabungan kota tidak teradi bias, sedangkan pada gabungan seluruh wilayah memiliki nilai sig. (2-*tailed*)<0,05 yaitu 0,014 maka H_0 *reject* sehingga akurasi estimasi *overall* seluruh wilayah teradi bias.


Tabel 4.20 Ringkasan Uji Hipotesis Akurasi Estimasi Aktivitas

No	Keterangan	N	*Mean*	*Std. Deviation*	df	Sig. (2-*tailed*)	Interpretasi
1	Akurasi_TotalAktivitas_Provinsi_Yogyakarta	19	4,6842	6,84797	18	0,008	Bias
2	Akurasi_TotalAktivitas_Sleman	3	2	3,4641	2	0,423	Tidak Bias
3	Akurasi_TotalAktivitas_Kulon_Progo	9	0	0	8	-	Tidak Bias
4	Akurasi_TotalAktivitas_Gunung_Kidul	3	10	8,66025	2	0,184	Tidak Bias
5	Akurasi_TotalAktivitas_Kota_Yogyakarta	20	3,05	5,62396	19	0,025	Bias
6	Akurasi_TotalAktivitas_Wilayah_Kota	35	2,7714	5,43456	34	0,005	Bias
7	Akurasi_TotalAktivitas_Seluruh_Wilayah	54	3,4444	5,97689	53	0	Bias

Tabel 4.20 menunjukan nilai sig. (2-*tailed*) dari hasil perhitungan SPSS tiap masing-masing daerah, pada Provinsi Yogyakarta memiliki nilai sig. (2-*tailed*)<0, yaitu 0,008 maka H_0 *reject* sehingga akurasi estimasi *total aktivitas* Provinsi Yogyakarta teradi bias, pada Kabupaten Sleman memiliki nilai sig. (2-*tailed*)>0,05 yaitu 0,423 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi total aktivitas Kabupaten Sleman tidak teradi bias, pada Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai *Mean* 0 dan *Std.Deviation* sebesar 0 itu menandakan bahwa estimasi akurasi proyek sesuai prediksi, dengan *Std.Deviation* yang konstan maka H_0 *can't reject*, pada kota Kabupaten Gunung Kidul memiliki nilai sig. (2-*tailed*)>0,05 yaitu 0,184 maka H_0 *can't reject* sehingga akurasi estimasi total aktivitas


Kabupaten Gunung Kidul tidak teradi bias, pada kota Yogyakarta memiliki nilai sig. (2-*tailed*)<0,05 yaitu 0,025 maka H_0 *reject* sehingga akurasi estimasi total aktivitas kota Yogyakarta teradi bias, pada gabungan kota memiliki nilai sig. (2-*tailed*)<0,05 yaitu 0,005 maka H_0 *reject* sehingga akurasi estimasi total aktivitas gabungan kota teradi bias, dan pada gabungan seluruh wilayah memiliki nilai sig. (2-*tailed*)<0,05 yaitu 0 maka H_0 *reject* sehingga akurasi estimasi total aktivitas seluruh wilayah teradi bias.

Dapat dilihat dari gambar 4.3 dan tabel 4.6 wilayah yang terjadi bias. Untuk melihat pola-pola dari tiap kota yang ada di Provinsi Yogyakarta maka dibuatlah diagram pola bias seperti gambar dibawah ini:

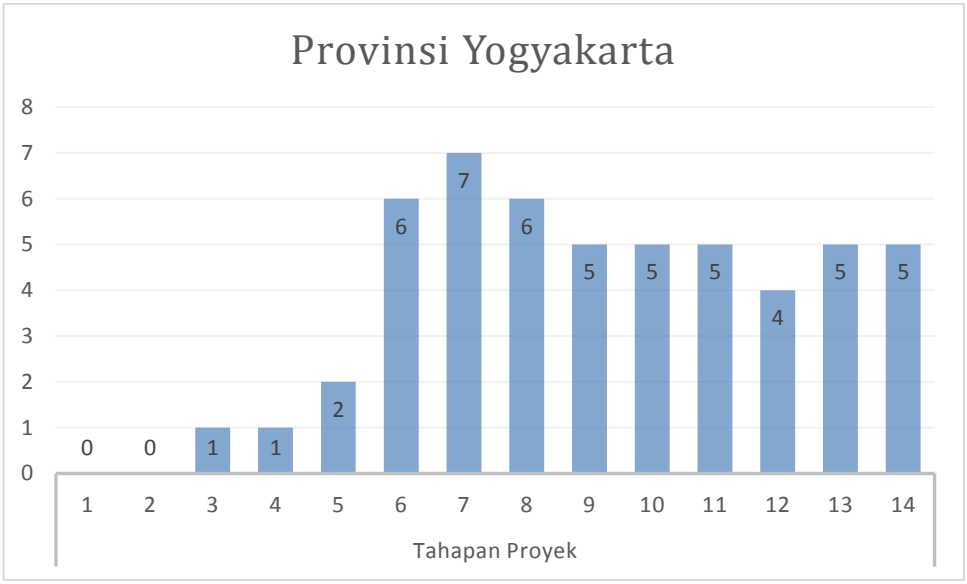


Gambar 4.3 Bias Tahapan LPSE Provinsi Yogyakarta

Gambar 4.3 menunjukan bias tahapan yang terjadi pada LPSE Provinsi Yogyakarta, dimana tahapan ke-7 atau evaluasi dokumen kualifikasi mendapatkan perbuahan terbanyak yaitu sebanyak 7 kali pada waktu lelang proyek LPSE Provinsi Yogyakarta.

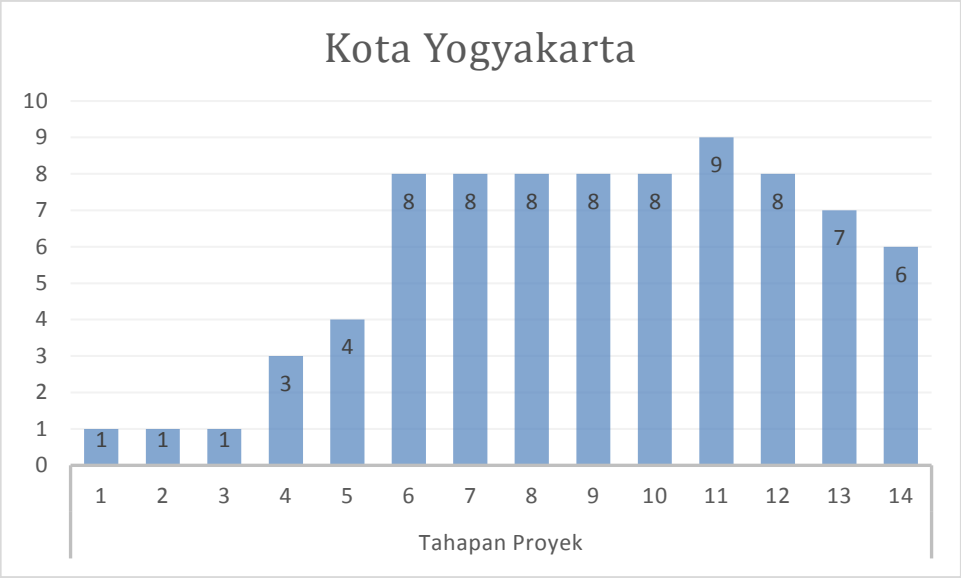


Gambar 4.4 Bias Tahapan LPSE Kota Yogyakarta

Gambar 4.4 menunjukan bias tahapan yang terjadi pada LPSE Provinsi Yogyakarta, dimana tahapan ke-11 atau pengumuman pemeanang mendapatkan perbuahan terbanyak yaitu sebanyak 9 kali pada waktu lelang proyek LPSE kota Yogyakarta.

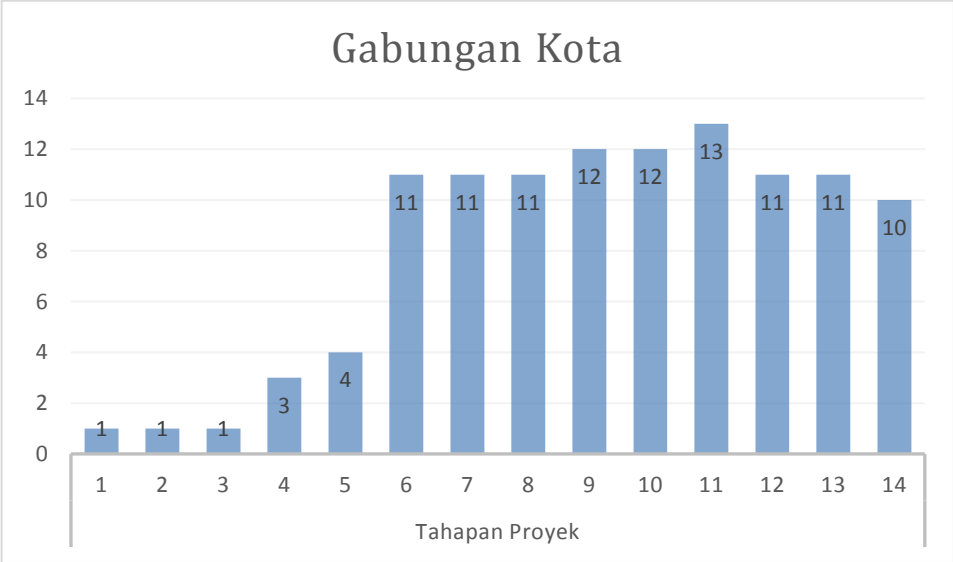

Gambar 4.5 Bias Tahapan LPSE Gabungan Seluruh Kota

Gambar 4.5 menunjukan bias tahapan yang terjadi pada LPSE Provinsi Yogyakarta, dimana tahapan ke-11 atau pengumuman pemenang mendapatkan perbuahan terbanyak yaitu sebanyak 13 kali pada waktu lelang proyek LPSE dari gabungan seluruh kota.

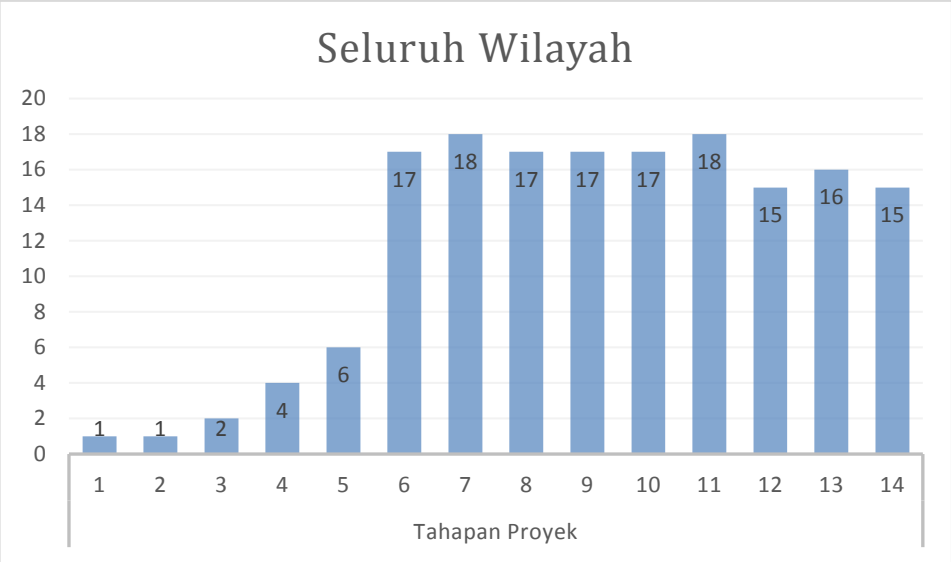

Gambar 4.6 Bias Tahapan LPSE Gabungan Seluruh Wilayah Provinsi Yogyakarta.

Gambar 4.6 menunjukan bias tahapan yang terjadi pada LPSE Provinsi Yogyakarta, dimana tahapan ke-7 atau evaluasi dokumen kualifikasi dan tahapan ke-11 atau pengumuman pemenang mendapatkan perbuahan terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 18 kali pada waktu lelang proyek LPSE seluruh wilayah Provinsi Yogyakarta.

Ketika mengetahui pola perubahan di tiap tahapan proyek yang terjadi bias pada wilayah Yogyakarta selanjutnya adalah melakukan perhitungan terhadap permasalahan bias pada wilayah Yogyakarta, hasil perhitungan dijelaskan dari tabel 4.21 sampai 4. 24 sebagai berikut:

Tabel 4.21 Permasalahan Bias Provinsi Yogyakarta

Permasalahan	Jumlah
Evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi belum terselesaikan	29
Permasalahan pada server aplikasi	9
Panitia memerlukan tambahan waktu	6
Panitia memberikan tambahan waktu untuk penyedia jasa	4
Perubahan jadwal dikarenakan Hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 libur nasional	2
Pokja ada koreksi untuk Nilai penawaran yang kurang sesuai	1
Permasalahan teknis sistem	1
Pokja menyesuaikan dengan hari libur pemilukada serentak	1

Tabel 4.21 Diatas merupakan tabel permasalahan bias yang terjadi pada tiap tahapan lelang di LPSE Provinsi Yogyakarta, dimana pada evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi sering kali terjadi permasalahan yaitu sebanyak 29 kali.

Tabel 4.22 Permasalahan Bias Kota Yogyakarta

Permasalahan	Jumlah
Evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi belum terselesaikan	31
Menyesuaikan tahapan sebelumnya	26
Permasalahan pada server aplikasi	9
Permasalahan teknis sistem	7
Perkiraan waktu evaluasi terlalu lama.	1
Jadwal diperpanjang karena belum ada yang memasukkan penawaran	1

Tabel 4.22 Diatas merupakan tabel permasalahan bias yang terjadi pada tiap tahapan lelang di LPSE kota Yogyakarta, dimana pada evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi sering kali terjadi permasalahan yaitu sebanyak 31 kali.

Tabel 4.23 Permasalahan Bias Gabungan Kota

Permasalahan	Jumlah
Evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi belum terselesaikan	40
Menyesuaikan tahapan sebelumnya	26
Panitia memerlukan tambahan waktu	18
Permasalahan pada server aplikasi	12
Permasalahan teknis sistem	7
Adanya sanggahan dari peserta lelang	2
Perkiraan waktu evaluasi terlalu lama.	1
Jadwal diperpanjang karena belum ada yang memasukkan penawaran	1

Tabel 4.23 Diatas merupakan tabel permasalahan bias yang terjadi pada tiap tahapan lelang di LPSE gabungan kota Yogyakarta yang terdiri dari Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan kota Yogyakarta, dimana pada evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi sering kali terjadi permasalahan yaitu sebanyak 40 kali.

Tabel 4.24 Permasalahan Bias Seluruh Wilayah

Permasalahan	Jumlah
Evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi belum terselesaikan	69
Menyesuaikan tahapan sebelumnya	26
Panitia memerlukan tambahan waktu	24
Permasalahan pada server aplikasi	21
Permasalahan teknis sistem	8
Panitia memberikan tambahan waktu untuk penyedia jasa	4
Adanya sanggahan dari peserta lelang	2
Perubahan jadwal dikarenakan Hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 libur nasional	2
Pokja ada koreksi untuk Nilai penawaran yang kurang sesuai	1
Pokja menyesuaikan dengan hari libur pemilukada serentak	1
Perkiraan waktu evaluasi terlalu lama.	1
Jadwal diperpanjang karena belum ada yang memasukkan penawaran	1

Tabel 4.24 Diatas merupakan tabel permasalahan bias yang terjadi pada tiap tahapan lelang di LPSE seluruh wilayah Provinsi Yogyakarta, dimana pada evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi sering kali terjadi permasalahan yaitu sebanyak 69 kali.

4.6 Perhitungan Bias Akurasi estimasi Kota, dan Provinsi

Poin ketiga yang diobservasi dalam penelitian ini adalah perhitungan bias akurasi yang terjadi antara kota, dan proinsi. Perhitungan bias akurasi ini menggunakan uji beda rata-rata 2 sampel karena terdapat 2 populasi yaitu data gabungan seluruh kota, dan data Provinsi Yogyakarta. Uji beda rata-rata 2 sampel digunakan untuk menentukan apakah data sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Jadi tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain.

Langkah dalam menentukan uji *Independent Sample T-test* ini adalah:

a. Menentukan Hipotesis Pengujian

Ho : $\mu_1 = \mu_2$ = Tidak terdapat perbedaaan Akurasi Waktu lelang proyek antaran kota dan Provinsi Yogyakarta.

Ha : $\mu_1 \neq \mu_2$ = Terdapat perbedaaan Akurasi Waktu lelang proyek antaran kota dan Provinsi Yogyakarta.

b. Kriteria pengujian:

Jika nilai probabilitas (α) > 0,05 maka Ho *can't reject*.

Jika nilai probabilitas (α) ≤ 0,05 makan Ho *reject*.

c. Menentukan Harga Statistik Penguji

Karena yang diuji adalah parameter μ sebagai harga rata-rata populasi maka pengujiannya adalah harga statistik x sebagai harga rata-rata sampelnya.

Dalam perhitungannya, uji beda rata-rata 2 populasi ini menggunakan *software* SPSS pada menu data *Analyze* yang hasilnya akan di jelaskan oleh tabel 4.20 dan 4.21

Tabel 4.25 Hasil Uji Beda Antara Kota Dan Provinsi Waktu *Overall*

		Levene's Test for Equality of Variances		*t-test for Equality of Means*				
		F	Sig.	t	df	*Sig. (2-tailed)*	*Mean Difference*	*Std. Error Difference*
Akurasi_*Overall*	*Equal variances assumed*	15,162	,000	2,038	58	,046	1,57500	,77274
	Equal variances not assumed			1,574	21,864	,130	1,57500	1,00033

Dalam tabel 4.20, maka diperoleh nilai sig 0.139 > 0.05. Dengan demikian Ho *can't reject* yang artinya tidak terdapat perbedaaan akurasi *overall* waktu lelang proyek antaran kota dan Provinsi di Yogyakarta.

Tabel 4.26 Hasil Uji Beda Antara Kota Dan Provinsi Total Aktivitas

		Levene's Test for Equality of Variances		*t-test for Equality of Means*				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-*tailed*)	Mean Difference	Std. Error Difference
Akurasi_*Activity*	*Equal variances assumed*	1,603	,211	1,126	52	,265	1,91278	1,69890
	Equal variances not assumed			1,051	30,523	,301	1,91278	1,81989

Dalam tabel 4.21, maka diperoleh nilai sig 0.265 > 0.05. Dengan demikian Ho *can't reject* yang artinya Tidak terdapat perbedaaan akurasi total aktivitas waktu lelang proyek antaran kota dan Provinsi di Yogyakarta.

4.7 Perhitungan Bias Akurasi Estimasi antara Kota-kota

Poin keempat yang diobservasi pada penelitian ini adalah bias akurasi yang terjadi antara kota-kota yang ada di Provinsi Yogyakarta, maka akan dilakukan uji *anova one way* terhadap kota Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Cara menghitung uji *anova* dilakukan dengan software SPSS 18 untuk mempermudah pengerjaan, dengan fungsi *analyze* kemudian pilih *compare mean* dan pilihlah *anova one way*, Maka di dapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.27 Hasil Uji *Anova Overall Project Time*

Source of Variation	*Sum of Squares*	df	*Mean Square*	F	Sig.
Between Groups	1,008	3	,336	,113	,952
Within Groups	106,767	36	2,966		
Total	107,775	39			

Uji *Anova* digunakan untuk menguji apakah nila akurasi *overall* keempat wilayah kota mempunyai rata-rata yang sama. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji *Anova* dalam tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai probabilitas akurasi *overall* 0,952 > 0,05. Dengan demikian hipotesis nol (H_0) dari akurasi *overall can't reject*.

Tabel 4.28 Hasil Uji *Anova* Total *Activity Project Time*

Source of Variation	*Sum of Squares*	df	*Mean Square*	F	Sig.
Between Groups	229,221	3	76,407	3,056	,043
Within Groups	774,950	31	242,998		
Total	1004,171	34			

Pada uji *anova* selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah niali akurasi *activities* dari keempat wilayah kota mempunyai rata-rata yang sama. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji *anova* dalam tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai probabilitas akurasi *activities* 0,043 < 0,05. Dengan demikian hipotesis nol (H_0) dari akurasi *activities time reject*, maka (H_1) *can't reject* yang menandakan adanya perbedaan dari keempat wilayah kota pada LPSE wilayah Yogyakarta.

Pada kedua uji *anova* diatas tidak terdapat perbedaan dari perhitungan *overall* sedangkan pada total aktivitasnya terdapat perbedaan.

4.8 Distribusi Waktu Aktual

Pada penelitian ini mengobservasi analisis pola distribusi data waktu *overall* aktual pengerjaan waktu lelang proyek terhadap seluruh proyek yang kemudian untuk mengetahui pola distribusi yang cocok dengan data waktu *overall* aktual tersebut. Distribusi yang dihasilkan dari data waktu aktual ini dibandingkan dengan distribusi yang sudah sering digunakan merepresentasikan pengerjaan suatu proyek.


Analisi pola distribusi data waktu pengerjaan proyek perusahaan dilakukan menggunakan *software ProModel*.

Dari proses Auto::Fit yang dapat dilihat dari gambar

Auto::Fit of Distributions

distribution	rank	acceptance
Beta[17., 146, 2., 27.7]	97.5	do not reject
Weibull[16.8, 1.51, 9.68]	95.1	do not reject
Gamma[16.4, 2.31, 3.96]	86.3	do not reject
Extreme Value IA[22.9, 4.4]	80.6	do not reject
Inverse Gaussian[13.4, 48.3, 12.2]	72.7	do not reject
Lognormal[13.7, 2.35, 0.493]	70.2	do not reject
Pearson 5[10.1, 8.07, 109]	68.2	do not reject
Inverse Weibull[-20.2, 10.2, 2.33e-002]	66.1	do not reject
Erlang[16.4, 2., 4.57]	60.	do not reject
Pearson 6[17., 28.4, 2.61, 9.46]	54.2	do not reject
Chi Squared[11.9, 13.5]	47.4	do not reject
LogLogistic[17., 2.31, 7.13]	37.8	do not reject
Logistic[25., 3.21]	30.8	do not reject
Rayleigh[15.6, 8.2]	21.2	do not reject
Normal[25.5, 5.91]	5.69	do not reject
Triangular[16.5, 44.6, 19.]	0.728	reject
Exponential[17., 8.55]	3.3e-002	reject
Extreme Value IB[28.8, 7.17]	2.57e-002	reject
Pareto[17., 2.61]	1.61e-004	reject
Power Function[17., 43.5, 0.695]	0.	reject
Uniform[17., 43.]	0.	reject
Johnson SB	no fit	reject

Gambar 4.7 Hasil Distribusi *Overall* Wilayah Yogyakarta

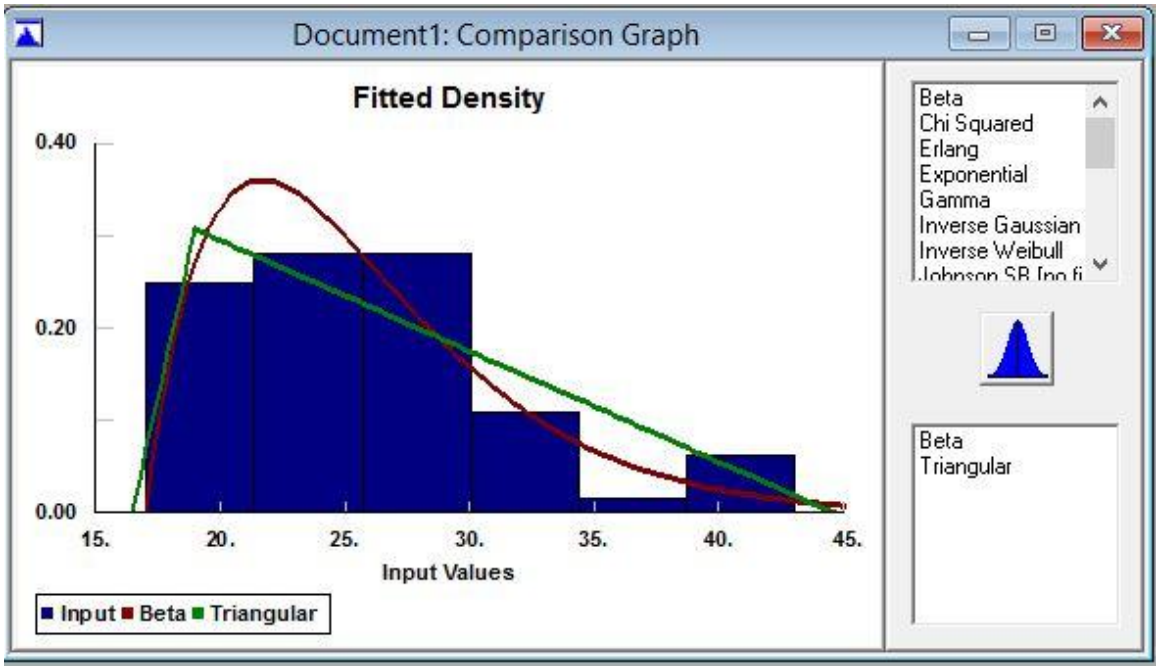

Gambar 4.8 Pola Data Distribusi Wilayah Yogyakarta

Dari hasil diatas diketahui terdapat 23 pola distribusi yang muncul, dari 23 distribusi terdapat 16 distribusi yang di terima dan sissanya *reject*. Pada distribusi Beta memiliki nilai rank tertinggi oleh karena itu distribusi Beta cocok untuk mewakilkan pola distribusi

waktu aktual *overall* lelang. Lalu distribusi Beta[17,, 146, 2,, 27,7] ini dibandingkan dengan distribusi yang sudah sering digunakan untuk merepresentasikan pengerjaan suatu proyek yaitu dengan distribusi tringular.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kajian Bias pada LPSE Wilayah Provinsi Yogyakarta

Pada penelitian ini akan mengkaji fenomena *Judgmental Biases* yang terjadi pada waktu lelang proyek yang dilaksanakan secara online oleh Leayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk dapat melakukan perhitungan akurasi dari setiap waktu lelang proyek pada LPSE ditentukan oleh 2 variabel yaitu waktu total pengerjaan (*overall time*) dan waktu total aktivitas (*activity time*), sehingga akhirnya mendapatkan hasil bias dari masing-masing proyek yang ada di kota-kota dalam wilayah Yogyakarta.

Dari hasil perhitungan bias terdapat 2 bias yang akan terjadi yaitu bias positif dan bias negatif, bias positif adalah dimana waktu aktual lelang lebih cepat dari waktu yang telah di prediksi oleh panitia lelang LPSE sedangkan bias negatif adalah waktu aktual lelang lebih lama dari waktu yang telah di prediksi oleh panitia lelang LPSE. Dalam proses perhitungan bias, penelitian ini menggunakan *software* SPSS untuk melakukan uji one *sample t-test, indepedent sample t-test* dan *anova one way*. Data yang digunakan adalah data waktu lelang proyek yang memiliki 14 tahapan pada setiap lelangnya dan data tersebut adalah data yang dikumpulkan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 30 April 2017.

5.2 Analisis Akurasi Waktu *Overall* dan Total Aktivitas

Pada analisis akurasi terdapat 2 perhitungan akurasi dalam waktu lelang proyek LPSE ini yaitu untuk mengetahui akurasi *overall* dan akurasi total aktivitas. Pada peritungan akurasi yang telah dilakukan terdapat 2 bias akurasi yang terjadi yaitu bias akurasi positif dan bias akurasi negatif. Bias akurasi positif adalah dimana waktu aktual lelang proyek itu lebih cepat dari waktu yang telah diprediksi di awal proyek, sedangkan bias akurasi negatif adalah bias akurasi yang terjadi ketika waktu actual proyeknya lebih lama dari waktu yang telah di prediksi. Pada proses pehitungan akurasi bias akurasi positif akan dijadikan sebagai data pre-processing, dimana data tersebut tidak diperlukan.

Bias akurasi positif tidak digunakan karena dalam penelitian ini bias akurasi yang dicari adalah bias akurasi keterlambatan pada waktu lelang proyek di LPSE bukan karena percepatan yang terjadi. Sehingga jika dilakukan perhitungan statistika menggunakan *software* SPSS nanti akan menyebabkan ketidak sesuaian hasil yang terjadi.

5.3 Bias Waktu *Overall* dan Total Aktivitas

Berdasarkan hasil dari perhitungan bias waktu akurasi *overall* dan waktu akurasi total aktivitas yang menggunakan *software* SPSS, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bias Akurasi *Overall Time*

Dari hasil perhitungan bias dengan uji *one sample t-test* dapat diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat bias pada gabungan seluruh wilayah di Provinsi Yogyakarta dengan dibuktikannya dari hasil uji *one sample t-test* dengan nilai signifikansi 0.014, sehingga interpretasinya adalah bias. Untuk penjelasan yang lebih jelas di jabarkan oleh tabel 5.1

Tabel 5.1 Bias Akurasi *Overall Time*

No	Keterangan	N	Sig. (2-*tailed*)	Interpretasi
1	Akurasi_*Overall*_Provinsi_Yogyakarta	20	0,052	Tidak Bias
2	Akurasi_*Overall*_Sleman	3	0,423	Tidak Bias
3	Akurasi_*Overall*_Kulon_Progo	10	0,343	Tidak Bias
4	Akurasi_*Overall*_Gunung_Kidul	3	-	Tidak Bias
5	Akurasi_*Overall*_Kota_Yogyakarta	24	0,243	Tidak Bias
6	Akurasi_*Overall*_Wilayah_Kota	40	0,114	Tidak Bias
7	Akurasi_*Overall*_Seluruh_Wilayah	60	0,014	Bias

2. Bias Akurasi Total *Activity Time*

Diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat bias pada LPSE wilayah di Provinsi Yogyakarta dengan dibuktikannya dari hasil uji *one sample t-test* dengan nilai signifikansi 0.0080, selain itu juga bias terjadi pada LPSE Kota Yogyakarta yang memiliki nilai signifikansi 0.023, lalu bias juga terjadi pada LPSE gabungan dari wilayah kota dengan nilai signifikansi 0.046, dan bias juga terjadi pada LPSE gabungan seluruh wilayah Provinsi Yogyakarta yang memiliki nilai signifikansi 0.0001, sehingga interpretasinya adalah bias. Untuk penjelasan yang lebih jelas di jabarkan oleh tabel 5.2

Tabel 5.2 Bias Akurasi Total *Activity Time*

No	Keterangan	N	Sig. (2-*tailed*)	Interpretasi
1	Akurasi_*Total*Aktivitas_Provinsi_Yogyakarta	19	,0080	Bias
2	Akurasi_TotalAktivitas_Sleman	3	,4226	Tidak Bias
3	Akurasi_TotalAktivitas_Kulon_Progo	9	,1835	Tidak Bias
4	Akurasi_TotalAktivitas_Gunung_Kidul	3	1,000	Tidak Bias
5	Akurasi_TotalAktivitas_Kota_Yogyakarta	20	,0239	Bias
6	Akurasi_TotalAktivitas_Wilayah_Kota	35	,0046	Bias
7	Akurasi_TotalAktivitas_Seluruh_Wilayah	54	,0001	Bias

Karena terdapat bias yang tejadi bedasarkan waktu *overall* dan waktu total aktivitas maka dilakukan pembentukan pola bias terhadap tahapan tiap waktu lelang proyek. Maka dilakuka kajian selanjutnya dengan mentrasformasikan data yang terjadi bias tersebut hingga mendapatkan urutan tahapan yang mengalami perubahan dari yang paling banyak hingga paling sedikit dan berikut adalah hasilnya:

Tabel 5.3 Rank Perubahan Tahapan

Rangking	Tahapan	Jumlah Perubahan
1	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	18
1	Pengumuman Pemenang	18
2	Evaluasi Penawaran	17
2	Pembuktian Kualifikasi	17
2	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	17
2	Penetapan Pemenang	17
3	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16
4	Masa Sanggah Hasil Lelang	15
4	Penandatanganan Kontrak	15
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	6
6	Upload Dokumen Penawaran	4
7	Pemberian Penjelasan	2
8	Pengumuman Pascakualifikasi	1
8	Download Dokumen Pengadaan	1

Tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan tahapan Pengumuman Pemenang adalah tahapan yang sangat sering mengalami perubahan dari total 64 proyek yang ada pada LPSE wilayah Provinsi Yogyakarta tahapan tersebut mengalami 18 kali perubahan hal

ini dapat di identifikasikan penyebab bias yang terjadi pada LPSE wilayah Provinsi Yogyakarta dan harus segera dilakukan perbaikan pada sistem tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan tahapan pengumuman pemenang. Untuk mengetahui permasalahan apa yang sering terjadi peneliti juga menghitung permasalahan-pemasalahan yang sudah dijabarkan pada keterangan proyek setiap lelang di LPSE wilayah Yogyakarta. Tabel permasalahan tersebut akan dijabarkan dalam tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4 Permasalahan Bias Seluruh Wilayah Yogyakarta

Permasalahan	Jumlah
Evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi belum terselesaikan	69
Menyesuaikan tahapan sebelumnya	26
Panitia memerlukan tambahan waktu	24
Permasalahan pada server aplikasi	21
Permasalahan teknis sistem	8
Panitia memberikan tambahan waktu untuk penyedia jasa	4
Adanya sanggahan dari peserta lelang	2
Perubahan jadwal dikarenakan Hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 libur nasional	2
Pokja ada koreksi untuk Nilai penawaran yang kurang sesuai	1
Pokja menyesuaikan dengan hari libur pemilukada serentak	1
Perkiraan waktu evaluasi terlalu lama.	1
Jadwal diperpanjang karena belum ada yang memasukkan penawaran	1

Dari tabel 5.4 dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya bias pada tiap tahapan waktu lelang proyek. Dari data tersebut permasalahan keterlambatan yang sering terjadi adalah pada proses evaluasi yang belum selesai yang disebabkan oleh beban kerja pada panitia lelang. Karena pada LPSE setiap panitia lelang bisa memegang lebih dari satu proyek sehingga ketika ada kegiatan proyek yang dilakukan secara bersamaan maka panitia tidak dapat menangani dengan baik yang akibatnya pada proses evaluasi tidak dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah di tentukan atau mengalami keterlambatan. Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain yaitu menyesuaikan tahapan sebelumnya dimana terjadi *bottle neck* ketika suatau tahapan terjadi keterlambatan dan akan menunda tahapan selanjutanya, dan juga terdapat alasan lainya yaitu permasalahan pada server aplikasi.

Setelah mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan dari tiap tahapan lelang pada LPSE wilayah Yogyakarta maka dilakukan perhitungan penyebab bias dari setiap tahapan lelang yang akan di jabarkan pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Tabel Penyebab Bias Tiap Tahapan

No	Tahapan	Penyebab
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Server Aplikasi Tidak Dapat Diakses
2	Download Dokumen Pengadaan	Server Aplikasi Tidak Dapat Diakses
3	Pemberian Penjelasan	Kurangnya Peserta Lelang
4	Upload Dokumen Penawaran	Server Aplikasi Tidak Dapat Diakses
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Menyesuaikan Tahapan Sebelumnya
6	Evaluasi penawaran	Beban Kerja
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Beban Kerja
8	Pembuktian Kualifikasi	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan
10	Penetapan pemenang	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan
11	Pengumuman Pemenang	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan
14	Penandatanganan Kontrak	Waktu Evaluasi Belum Terselesaikan

5.4 Bias LPSE Anatara Kota, dan Provinsi

Pada penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui fenomena *Judgmental Biases* yang terjadi diantara masing-masing kota serta Provinsi untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan antara gabungan kota dengan Provinsi baik dari *overall time* maupun total aktivitas *time*, sehingga dilakukan uji hipotesis yang menghasilkan data bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara gabungan kota dan Provinsi Yogyakarta baik dari *overall time* maupun dari waktu total aktivitas. Tetapi berbeda dengan uji hipotesis lain yang dilakukan yaitu *anova* yang mendapat hasil berbeda antara waktu *overall* dan waktu total aktivitas yang dimana hasil waktu *overall* menyatakan tidak terdapat perbedaan bias yang terjadi antar kota sedangkan untuk waktu total aktivitas mengindikasikan bias yang terjadi di tiap kota terdapat perbedaan.

5.5 Distribusi Waktu Lelang

Untuk mengetahui informasi data yang ada pada waktu lelang proyek di LPSE maka kita melakukan analisis bagaimana pola distribusi dengan menggunakan *software* promodel. Data yang digunakan adalah waktu estimasi *overall* waktu lelang proyek pada LPSE yang dimana data tersebut bersifat *continue*. Dan ditemukanlah sebuah pola distribusi yang cocok dengan data waktu *overall* pelelangan tersebut yaitu pola distribusi Beta [17,, 146, 2,, 27,7].

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini menemukan bias yang sistematis antara estimasi dan kondisi aktual yang terjadi pada Provinsi Yogyakarta, kota Yogyakarta, gabungan seluruh kota, dan gabungan seluruh wilayah.
2. Berdasarkan analisis bias yang telah dilakukan dapat dikethui tahapan LPSE yang paling berpengaruh terhadap bias yang terjadi di Provinsi Yogyakarta yaitu pada tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan pada tahapan pengumuman pemenang, yang penyebab dari bias tersebut adalah beban kerja.
3. Berdasarkan analisis bias dapat diketahui faktor permasalahan bias yang paling berpengaruh terhadap bias yaitu pada waktu evaluasi.
4. Distribusi triangular dan distribusi beta dapat mempresentasikan waktu aktual pengerjaan proyek, dari hasil perhitungan pola distribusi diatas distribusi yang mewakili waktu lelang proyek di LPSE wilayah Yogyakarta adalah Beta [17,, 146, 2,, 27,7] dengan nilai rank 97,5.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada LPSE wilayah Yogyakarta dan penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi LPSE Wilayah Yogyakarta

   Saran yang diberikan kepada LPSE seluruh wilayah Yogyakarta adalah perbaikan permasalahan server aplikasi LPSE dengan cara melakukan maintenance pada server aplikasi perangkat lunak SPSE, dan perbaikan permasalahan *human eror* dengan cara memberi batasan jumlah proyek kepada panitia lelang yang akan mengambil proyek lebih dari satu agar tidak terjadi beban kerja pada panitia lelang dalam melakukan evaluasi dokumen kualifikasi serta tidak terjadi keterlambatan yang akan mempengaruhi tatakala tahapan selanjutnya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya bisa berfokus pada waktu distribusi yang dihasilkan oleh peneitian ini untuk analisis resiko proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Andrea Caputo. 2016. *Overcoming judgmental biases in negotiations: A scenario-based survey analysis on third party direct intervention: Journal of Business Research.* Lincoln Business School, University of Lincoln.

Bazerman, M.H., 2001, *Judgment in Managerial Decision Making*, 5th Edition, John Wiley & Sons, New York.

Cuneyt Eroglu & Keely L.Croxton. 2010. *Biases in judgmental adjustments of statistical forecasts: The role of individual differences: International jurnal of forecasting* 26 (2010) 116-133.

Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi)*, Andi, Yogyakarta.

Haming, Murdifin dan Nurnajamuddin, Mahfud. 2007. *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Handayani, Dwi. 2016. *Study of judgmental biases on activity duration estimations of information technology projects*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Handoko, Hani. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Husen, Abrar. 2009. *Manajemen Proyek. Yogyakarta*: Andi Offset.

Kennedy, J. J., & Bush, A. J. (1985). *An introduction to the design and analysis of experiments in behavioral research*. University Press of America.

Larson, I. C. F., & Erik, W. (2006). *Manajemen Proyek*: Proses Manajerial-3/E.

Leonda Gesti, 2008, *Studi Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi Pada Tahun 2007 Di Daerah Belitung*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

LPSE. 2012. *Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*. Diambil kembali dari LPSE: https://lpse.lkpp.go.id/eproc/.

Proboyo Budiman, 1999, *Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek: Klasifikasi Dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya*, Universitas Kristen Petra, Jawa Timur.

Riduwan.2008. *Rumus dan Data dalam aplikasi statistika*. Alfabeta. Bandung.

Sarwono, Jonathan. 2010. *PASW Statistics 18. Yogyakarta*: Penerbit Andi.

Schwalbe, Kathy. 2006. *Information Technology Project Managemen*. Edisi ke-4. Boston Massachusetts: Couerse Technology.

Shefrin, H. (2007, June). *Behavioral finance: biases, mean–variance returns, and risk premiums.* In CFA Institute Conference Proceedings Quarterly (Vol. 24, No. 2, pp. 4-12). CFA Institute.

Siregar, S. 2013. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.

Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek* (*Dari Konseptual Sampai Operasional*) Jilid 1, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

Soeharto, Iman. 2001. *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*. Jilid 2. Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga.

Tversky, A. dan Kahneman, D., 1974, *Judgment Under Uncertainty: Heuristic and Biases*, Science Journal, 85, 1124-1131.

LAMPIRAN

1. Nama Proyek : Pembangunan gedung kantor
   Region : Provinsi Yogyakarta
   Nilai HPS : Rp6.957.913.000,00

Pembangunan gedung kantor								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	12-Jan-17	18-Jan-17	7	12-Jan-17	18-Jan-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	12-Jan-17	23-Jan-17	12	12-Jan-17	23-Jan-17	12	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	23-Jan-17	8	16-Jan-17	23-Jan-17	8	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	23-Jan-17	25-Jan-17	3	23-Jan-17	25-Jan-17	3	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	23-Jan-17	31-Jan-17	9	23-Jan-17	31-Jan-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	23-Jan-17	31-Jan-17	9	23-Jan-17	31-Jan-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	31-Jan-17	01-Feb-17	2	31-Jan-17	01-Feb-17	2	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	02-Feb-17	02-Feb-17	1	02-Feb-17	02-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	04-Feb-17	04-Feb-17	1	04-Feb-17	04-Feb-17	1	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	09-Feb-17	09-Feb-17	1	09-Feb-17	09-Feb-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	13-Feb-17	14-Feb-17	2	13-Feb-17	14-Feb-17	2	Tidak Ada

2. Nama Proyek : Belanja Pakaian Kerja Lapangan

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp258.640.000,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	19-Jan-17	25-Jan-17	7	19-Jan-17	25-Jan-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	19-Jan-17	26-Jan-17	8	19-Jan-17	26-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23-Jan-17	23-Jan-17	1	23-Jan-17	23-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	30-Jan-17	02-Feb-17	4	06-Feb-17	14-Feb-17	9	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	30-Jan-17	02-Feb-17	4	06-Feb-17	14-Feb-17	9	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	03-Feb-17	03-Feb-17	1	09-Feb-17	14-Feb-17	6	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03-Feb-17	03-Feb-17	1	16-Feb-17	16-Feb-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	03-Feb-17	03-Feb-17	1	16-Feb-17	16-Feb-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	03-Feb-17	03-Feb-17	1	16-Feb-17	16-Feb-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	04-Feb-17	06-Feb-17	3	17-Feb-17	20-Feb-17	4	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07-Feb-17	07-Feb-17	1	22-Feb-17	22-Feb-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	08-Feb-17	10-Feb-17	3	23-Feb-17	27-Feb-17	5	Ada

3. Nama Proyek : Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Menjahit, Pelatihan Bordir, Pelatihan Salon Kecantikan di BLKPP DIY

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp552.850.000,00

Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Menjahit, Pelatihan Bordir, Pelatihan Salon Kecantikan di BLKPP DIY								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20-Jan-17	25-Jan-17	6	20-Jan-17	25-Jan-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	20-Jan-17	26-Jan-17	7	20-Jan-17	26-Jan-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23-Jan-17	23-Jan-17	1	23-Jan-17	23-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	30-Jan-17	03-Feb-17	5	30-Jan-17	03-Feb-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	30-Jan-17	03-Feb-17	5	30-Jan-17	03-Feb-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	04-Feb-17	06-Feb-17	3	04-Feb-17	06-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07-Feb-17	07-Feb-17	1	07-Feb-17	07-Feb-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	08-Feb-17	10-Feb-17	3	08-Feb-17	10-Feb-17	3	Tidak Ada

4. Nama Proyek : Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele, Nila, Gurami, Minapadi, Ugadi dan Ikan Hias

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp2.327.564.500,00

Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan Lele, Nila, Gurami, Minapadi, Ugadi dan Ikan Hias								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	01-Feb-17	06-Feb-17	6	01-Feb-17	06-Feb-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	01-Feb-17	09-Feb-17	9	01-Feb-17	09-Feb-17	9	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	04-Feb-17	10-Feb-17	7	04-Feb-17	10-Feb-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	10-Feb-17	13-Feb-17	4	10-Feb-17	13-Feb-17	4	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	10-Feb-17	16-Feb-17	7	10-Feb-17	16-Feb-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11-Feb-17	16-Feb-17	6	11-Feb-17	16-Feb-17	6	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	14-Feb-17	16-Feb-17	3	14-Feb-17	16-Feb-17	3	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	17-Feb-17	17-Feb-17	1	17-Feb-17	17-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	17-Feb-17	17-Feb-17	1	17-Feb-17	17-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	17-Feb-17	17-Feb-17	1	17-Feb-17	17-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Feb-17	20-Feb-17	3	18-Feb-17	20-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Feb-17	21-Feb-17	1	21-Feb-17	21-Feb-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Feb-17	23-Feb-17	2	22-Feb-17	23-Feb-17	2	Tidak Ada

5. Nama Proyek : Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, taman, dan halaman kantor BPK Perwakilan DIY

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp518.430.000,00

Pengadaan Jasa Pemeliharaan kebersihan gedung, taman, dan halaman kantor BPK Perwakilan DIY								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10-Feb-17	15-Feb-17	6	10-Feb-17	15-Feb-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	10-Feb-17	15-Feb-17	6	10-Feb-17	15-Feb-17	6	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	13-Feb-17	13-Feb-17	1	13-Feb-17	13-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	14-Feb-17	16-Feb-17	3	14-Feb-17	16-Feb-17	3	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	16-Feb-17	16-Feb-17	1	16-Feb-17	16-Feb-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	16-Feb-17	22-Feb-17	7	16-Feb-17	22-Feb-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Feb-17	22-Feb-17	3	20-Feb-17	22-Feb-17	3	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	22-Feb-17	22-Feb-17	1	22-Feb-17	22-Feb-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23-Feb-17	23-Feb-17	1	23-Feb-17	23-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	23-Feb-17	23-Feb-17	1	23-Feb-17	23-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	23-Feb-17	23-Feb-17	1	23-Feb-17	23-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	24-Feb-17	27-Feb-17	4	24-Feb-17	27-Feb-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28-Feb-17	28-Feb-17	1	28-Feb-17	28-Feb-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	28-Feb-17	28-Feb-17	1	28-Feb-17	28-Feb-17	1	Tidak Ada

6. Nama Proyek : Belanja Cetak

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp333.778.500,00

Belanja Cetak								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	25-Feb-17	06-Mar-17	10	25-Feb-17	06-Mar-17	10	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	25-Feb-17	06-Mar-17	10	25-Feb-17	06-Mar-17	10	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	27-Feb-17	27-Feb-17	1	27-Feb-17	27-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	27-Feb-17	06-Mar-17	8	27-Feb-17	06-Mar-17	8	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	06-Mar-17	09-Mar-17	4	06-Mar-17	09-Mar-17	4	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	06-Mar-17	09-Mar-17	4	06-Mar-17	09-Mar-17	4	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06-Mar-17	10-Mar-17	5	06-Mar-17	10-Mar-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	08-Mar-17	10-Mar-17	3	08-Mar-17	10-Mar-17	3	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	11-Mar-17	13-Mar-17	3	11-Mar-17	13-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14-Mar-17	15-Mar-17	2	14-Mar-17	15-Mar-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	16-Mar-17	17-Mar-17	2	16-Mar-17	17-Mar-17	2	Tidak Ada

7. Nama Proyek : Belanja Bahan Kimia Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp349.918.700,00

Belanja Bahan Kimia Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	22-Feb-17	28-Feb-17	7	22-Feb-17	28-Feb-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	22-Feb-17	01-Mar-17	8	22-Feb-17	01-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	24-Feb-17	24-Feb-17	1	24-Feb-17	24-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	24-Feb-17	02-Mar-17	7	24-Feb-17	02-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	07-Mar-17	6	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	07-Mar-17	6	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	08-Mar-17	3	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	07-Mar-17	07-Mar-17	1	08-Mar-17	09-Mar-17	2	Ada
10	Penetapan pemenang	07-Mar-17	07-Mar-17	1	08-Mar-17	09-Mar-17	2	Ada
11	Pengumuman Pemenang	07-Mar-17	07-Mar-17	1	08-Mar-17	09-Mar-17	2	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	08-Mar-17	10-Mar-17	3	09-Mar-17	13-Mar-17	5	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	14-Mar-17	20-Mar-17	7	14-Mar-17	20-Mar-17	7	Tidak Ada

8. Nama Proyek : Rehab Bangsal Pemijahan, *Hatchery*, Saluran Pembuangan Air dan Bak Karantina Ikan, BAT Cangkringan

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp2.679.936.000,00

Rehab Bangsal Pemijahan, *Hatchery*, Saluran Pembuangan Air dan Bak Karantina Ikan, BAT Cangkringan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	24-Feb-17	27-Feb-17	4	24-Feb-17	27-Feb-17	4	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	24-Feb-17	06-Mar-17	11	24-Feb-17	06-Mar-17	11	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	27-Feb-17	27-Feb-17	1	27-Feb-17	27-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	28-Feb-17	07-Mar-17	8	28-Feb-17	07-Mar-17	8	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	14-Mar-17	8	Ada
6	Evaluasi penawaran	08-Mar-17	15-Mar-17	8	08-Mar-17	15-Mar-17	8	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	08-Mar-17	15-Mar-17	8	08-Mar-17	15-Mar-17	8	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	13-Mar-17	15-Mar-17	3	13-Mar-17	15-Mar-17	3	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16-Mar-17	16-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	16-Mar-17	16-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	16-Mar-17	16-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	17-Mar-17	20-Mar-17	4	17-Mar-17	20-Mar-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Mar-17	21-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Mar-17	24-Mar-17	3	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Tidak Ada

9. Nama Proyek : Pengadaan Pakaian Jawa/Karawitan Untuk Desa/ Kaluran Budaya

   Region : Provinsi Yogyakarta

   Nilai HPS : Rp415.844.000,00

Pengadaan Pakaian Jawa/Karawitan Untuk Desa/ Kaluran Budaya								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	23-Feb-17	28-Feb-17	6	23-Feb-17	28-Feb-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	23-Feb-17	02-Mar-17	8	23-Feb-17	02-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	27-Feb-17	27-Feb-17	1	27-Feb-17	27-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	28-Feb-17	06-Mar-17	7	28-Feb-17	06-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	06-Mar-17	12-Mar-17	7	06-Mar-17	12-Mar-17	7	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	06-Mar-17	12-Mar-17	7	06-Mar-17	12-Mar-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06-Mar-17	12-Mar-17	7	06-Mar-17	13-Mar-17	8	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13-Mar-17	14-Mar-17	2	13-Mar-17	14-Mar-17	2	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	13-Mar-17	14-Mar-17	2	13-Mar-17	14-Mar-17	2	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	13-Mar-17	14-Mar-17	2	13-Mar-17	14-Mar-17	2	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	15-Mar-17	17-Mar-17	3	15-Mar-17	17-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20-Mar-17	21-Mar-17	2	20-Mar-17	21-Mar-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Mar-17	24-Mar-17	3	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Tidak Ada

10. Nama Proyek : Belanja Bahan Pakan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak
    Region : Provinsi Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp2.466.423.000,00

Belanja Bahan Pakan Kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	22-Feb-17	22-Feb-17	1	22-Feb-17	22-Feb-17	1	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	22-Feb-17	22-Feb-17	1	22-Feb-17	22-Feb-17	1	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	24-Feb-17	24-Feb-17	1	24-Feb-17	24-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	25-Feb-17	02-Mar-17	6	25-Feb-17	02-Mar-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	02-Mar-17	07-Mar-17	6	02-Mar-17	07-Mar-17	6	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	02-Mar-17	07-Mar-17	6	02-Mar-17	07-Mar-17	6	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	02-Mar-17	07-Mar-17	6	02-Mar-17	07-Mar-17	6	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	07-Mar-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	07-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	07-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	07-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	08-Mar-17	11-Mar-17	4	08-Mar-17	11-Mar-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	13-Mar-17	15-Mar-17	3	13-Mar-17	15-Mar-17	3	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	16-Mar-17	17-Mar-17	2	16-Mar-17	17-Mar-17	2	Tidak Ada

11. Nama Proyek : Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
    Region : Provinsi Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp431.314.000,00

Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20-Feb-17	24-Feb-17	5	20-Feb-17	24-Feb-17	5	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	20-Feb-17	27-Feb-17	8	20-Feb-17	27-Feb-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	22-Feb-17	22-Feb-17	1	22-Feb-17	22-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	23-Feb-17	28-Feb-17	6	23-Feb-17	28-Feb-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	28-Feb-17	01-Mar-17	2	28-Feb-17	01-Mar-17	2	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	28-Feb-17	06-Mar-17	7	28-Feb-17	06-Mar-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	01-Mar-17	06-Mar-17	6	01-Mar-17	06-Mar-17	6	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Mar-17	09-Mar-17	3	07-Mar-17	09-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	13-Mar-17	14-Mar-17	2	13-Mar-17	14-Mar-17	2	Tidak Ada

12. Nama Proyek : Pengadaan Pakaian Seni
    Region : Provinsi Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp874.995.000,00

Pengadaan Pakaian Seni								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21-Feb-17	28-Feb-17	8	21-Feb-17	28-Feb-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	21-Feb-17	01-Mar-17	9	21-Feb-17	01-Mar-17	9	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23-Feb-17	23-Feb-17	1	23-Feb-17	23-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	24-Feb-17	02-Mar-17	7	24-Feb-17	02-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Mar-17	09-Mar-17	3	07-Mar-17	09-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Mar-17	13-Mar-17	4	10-Mar-17	13-Mar-17	4	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	13-Mar-17	17-Mar-17	5	13-Mar-17	17-Mar-17	5	Tidak Ada

13. Nama Proyek : Belanja Bahan Kimia – IPLT

Region : Provinsi Yogyakarta

Nilai HPS : Rp406.425.000,00

Belanja Bahan Kimia - IPLT								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21-Feb-17	27-Feb-17	7	21-Feb-17	27-Feb-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	21-Feb-17	28-Feb-17	8	21-Feb-17	28-Feb-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23-Feb-17	23-Feb-17	1	23-Feb-17	23-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	23-Feb-17	01-Mar-17	7	23-Feb-17	02-Mar-17	8	Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	01-Mar-17	06-Mar-17	6	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Ada
6	Evaluasi penawaran	01-Mar-17	06-Mar-17	6	02-Mar-17	07-Mar-17	6	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	01-Mar-17	06-Mar-17	6	02-Mar-17	08-Mar-17	7	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	08-Mar-17	3	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	07-Mar-17	07-Mar-17	1	08-Mar-17	09-Mar-17	2	Ada
10	Penetapan pemenang	07-Mar-17	07-Mar-17	1	08-Mar-17	09-Mar-17	2	Ada
11	Pengumuman Pemenang	07-Mar-17	07-Mar-17	1	08-Mar-17	09-Mar-17	2	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	08-Mar-17	10-Mar-17	3	09-Mar-17	13-Mar-17	5	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	14-Mar-17	20-Mar-17	7	14-Mar-17	20-Mar-17	7	Tidak Ada

14. Nama Proyek : Konstruksi Rehabilitasi Dalem Suryowijayan

Region : Provinsi Yogyakarta

Nilai HPS : Rp3.071.945.685,00

Konstruksi Rehabilitasi Dalem Suryowijayan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	23-Feb-17	01-Mar-17	7	23-Feb-17	01-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	23-Feb-17	05-Mar-17	11	23-Feb-17	05-Mar-17	11	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	27-Feb-17	27-Feb-17	1	27-Feb-17	27-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	01-Mar-17	06-Mar-17	6	01-Mar-17	06-Mar-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	07-Mar-17	13-Mar-17	7	07-Mar-17	17-Mar-17	11	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	17-Mar-17	8	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	17-Mar-17	5	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14-Mar-17	14-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	15-Mar-17	15-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	15-Mar-17	15-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	16-Mar-17	20-Mar-17	5	22-Mar-17	27-Mar-17	6	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Mar-17	21-Mar-17	1	28-Mar-17	28-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	23-Mar-17	23-Mar-17	1	31-Mar-17	31-Mar-17	1	Ada

15. Nama Proyek : Pengadaan alat lab kimia – SPAM

    Region : Provinsi Yogyakarta

    Nilai HPS : Rp1.942.500.000,00

Pengadaan alat lab kimia - SPAM								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	07-Mar-17	13-Mar-17	7	07-Mar-17	13-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	07-Mar-17	14-Mar-17	8	07-Mar-17	14-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	09-Mar-17	09-Mar-17	1	09-Mar-17	09-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	10-Mar-17	15-Mar-17	6	10-Mar-17	15-Mar-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-Mar-17	16-Mar-17	2	15-Mar-17	16-Mar-17	2	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	15-Mar-17	22-Mar-17	8	15-Mar-17	22-Mar-17	8	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	16-Mar-17	22-Mar-17	7	16-Mar-17	22-Mar-17	7	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	17-Mar-17	22-Mar-17	6	17-Mar-17	22-Mar-17	6	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23-Mar-17	23-Mar-17	1	23-Mar-17	23-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	23-Mar-17	23-Mar-17	1	23-Mar-17	23-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	23-Mar-17	23-Mar-17	1	23-Mar-17	23-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	24-Mar-17	27-Mar-17	4	24-Mar-17	27-Mar-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29-Mar-17	29-Mar-17	1	29-Mar-17	29-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	30-Mar-17	31-Mar-17	2	30-Mar-17	31-Mar-17	2	Tidak Ada

16. Nama Proyek : Pengadaan Bahan Kimia / Reagensia
    Region : Provinsi Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp2.366.185.596,00

Pengadaan Bahan Kimia / Reagensia								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	13-Mar-17	11	03-Mar-17	13-Mar-17	11	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	13-Mar-17	11	03-Mar-17	13-Mar-17	11	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	07-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	08-Mar-17	14-Mar-17	7	08-Mar-17	14-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	14-Mar-17	15-Mar-17	2	14-Mar-17	15-Mar-17	2	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	22-Mar-17	9	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14-Mar-17	22-Mar-17	9	14-Mar-17	23-Mar-17	10	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Mar-17	20-Mar-17	1	23-Mar-17	23-Mar-17	1	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23-Mar-17	24-Mar-17	2	23-Mar-17	24-Mar-17	2	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Mar-17	27-Mar-17	3	25-Mar-17	27-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	27-Mar-17	28-Mar-17	2	27-Mar-17	30-Mar-17	4	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	29-Mar-17	31-Mar-17	3	31-Mar-17	31-Mar-17	1	Ada

17. Nama Proyek : Rehabilitasi Hatchery Lele, beserta kelengkapannya BAT Bejiharjo
    Region : Provinsi Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp1.534.673.554,48

Rehabilitasi Hatchery Lele, beserta kelengkapannya BAT Bejiharjo								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	07-Mar-17	14-Mar-17	8	07-Mar-17	14-Mar-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	07-Mar-17	14-Mar-17	8	07-Mar-17	14-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	08-Mar-17	08-Mar-17	1	09-Mar-17	09-Mar-17	1	Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	09-Mar-17	15-Mar-17	7	09-Mar-17	15-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	15-Mar-17	17-Mar-17	3	15-Mar-17	17-Mar-17	3	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	15-Mar-17	21-Mar-17	7	15-Mar-17	30-Mar-17	16	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	15-Mar-17	22-Mar-17	8	15-Mar-17	30-Mar-17	16	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Mar-17	22-Mar-17	3	20-Mar-17	30-Mar-17	11	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23-Mar-17	23-Mar-17	1	30-Mar-17	30-Mar-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	23-Mar-17	23-Mar-17	1	31-Mar-17	31-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	23-Mar-17	23-Mar-17	1	31-Mar-17	31-Mar-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	24-Mar-17	27-Mar-17	4	01-Apr-17	03-Apr-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28-Mar-17	28-Mar-17	1	04-Apr-17	04-Apr-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	29-Mar-17	03-Apr-17	6	05-Apr-17	07-Apr-17	3	Ada

18. Nama Proyek : Pengadaan Obat-obatan *non* e-katalog

    Region : Provinsi Yogyakarta

    Nilai HPS : Rp499.823.200,00

Pengadaan Obat-obatan *non* e-katalog								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	22/03/2017	29-Mar-17	8	22/03/2017	29-Mar-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	22-Mar-17	29-Mar-17	8	22-Mar-17	29-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	25-Mar-17	30-Mar-17	6	03-Apr-17	06-Apr-17	4	Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	30-Mar-17	30-Mar-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Ada
6	Evaluasi penawaran	30-Mar-17	04-Apr-17	6	07-Apr-17	13-Apr-17	7	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04-Apr-17	04-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	04-Apr-17	04-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	04-Apr-17	04-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	04-Apr-17	04-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	04-Apr-17	04-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	05-Apr-17	07-Apr-17	3	14-Apr-17	17-Apr-17	4	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	18-Apr-17	18-Apr-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	13-Apr-17	3	19-Apr-17	20-Apr-17	2	Ada

19. Nama Proyek : Pengadaan Barang Pupuk NPK dan Pupuk Organik
    Region : Provinsi Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp605.665.500,00

Pengadaan Barang Pupuk NPK dan Pupuk Organik								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	09/03/2017	13-Mar-17	5	09/03/2017	13 Maret 2017	5	Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	09-Mar-17	16-Mar-17	8	09-Mar-17	16-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17-Mar-17	20-Mar-17	4	17-Mar-17	20-Mar-17	4	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Mar-17	23-Mar-17	4	20-Mar-17	23-Mar-17	4	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Mar-17	23-Mar-17	4	20-Mar-17	23-Mar-17	4	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Mar-17	23-Mar-17	4	20-Mar-17	23-Mar-17	4	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Mar-17	27-Mar-17	3	25-Mar-17	27-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28-Mar-17	28-Mar-17	1	29-Mar-17	29-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	29-Mar-17	31/03/2017	3	30-Mar-17	04-Apr-17	6	Ada

20. Nama Proyek : Belanja Alat - alat / Perlengkapan PAB BPO

Region : Provinsi Yogyakarta

Nilai HPS : Rp333.196.050,00

Belanja Alat - alat / Perlengkapan PAB BPO								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	28-Feb-17	06-Mar-17	7	28-Feb-17	06-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	28-Feb-17	07-Mar-17	8	28-Feb-17	07-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	02-Mar-17	02-Mar-17	1	02-Mar-17	02-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	03-Mar-17	08-Mar-17	6	03-Mar-17	08-Mar-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	08-Mar-17	10-Mar-17	3	08-Mar-17	10-Mar-17	3	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	08-Mar-17	10-Mar-17	3	08-Mar-17	10-Mar-17	3	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	08-Mar-17	10-Mar-17	3	08-Mar-17	10-Mar-17	3	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	11-Mar-17	13-Mar-17	3	11-Mar-17	13-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14-Mar-17	15-Mar-17	2	14-Mar-17	15-Mar-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	15-Mar-17	17-Mar-17	3	15-Mar-17	17-Mar-17	3	Tidak Ada

21. Nama Proyek : Belanja Cetak Blangko Security

Region : Kota Bantul

Nilai HPS : Rp572.000.000,00

Belanja Cetak Blangko Security								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	20-Feb-17	24-Feb-17	5	20-Feb-17	24-Feb-17	5	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	20-Feb-17	27-Feb-17	8	20-Feb-17	27-Feb-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	23-Feb-17	23-Feb-17	1	23-Feb-17	23-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	24-Feb-17	28-Feb-17	5	24-Feb-17	28-Feb-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	28-Feb-17	28-Feb-17	1	28-Feb-17	28-Feb-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	01-Mar-17	06-Mar-17	6	01-Mar-17	14-Mar-17	14	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	01-Mar-17	06-Mar-17	6	01-Mar-17	14-Mar-17	14	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	07-Mar-17	08-Mar-17	2	15-Mar-17	16-Mar-17	2	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09-Mar-17	09-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	10-Mar-17	10-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	10-Mar-17	10-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	10-Mar-17	14-Mar-17	5	17-Mar-17	20-Mar-17	4	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	15-Mar-17	15-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	16-Mar-17	21-Mar-17	6	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Ada

22. Nama Proyek : Pengadaan Peralatan Jaringan Internet dan Intranet
    Region : Kota Bantul
    Nilai HPS : Rp405.118.000,00

Pengadaan Peralatan Jaringan Internet dan Intranet								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10-Mar-17	16-Mar-17	7	10-Mar-17	16-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	10-Mar-17	16-Mar-17	7	10-Mar-17	16-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17-Mar-17	21-Mar-17	5	17-Mar-17	21-Mar-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	21-Mar-17	24-Mar-17	4	21-Mar-17	24-Mar-17	4	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	23-Mar-17	24-Mar-17	2	23-Mar-17	27-Mar-17	5	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	27-Mar-17	4	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Mar-17	24-Mar-17	1	24-Mar-17	27-Mar-17	4	Ada
10	Penetapan pemenang	27-Mar-17	27-Mar-17	1	27-Mar-17	27-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	27-Mar-17	27-Mar-17	1	27-Mar-17	27-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	27-Mar-17	30-Mar-17	4	27-Mar-17	30-Mar-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Mar-17	30-Mar-17	1	30-Mar-17	30-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Mar-17	03-Apr-17	4	31-Mar-17	03-Apr-17	4	Tidak Ada

23. Nama Proyek : Tahap Lelang Saat Ini - [2166054] Pengadaan 1 (Satu) Unit Lift Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iv Yogyakarta
    Region : Kabupaten Sleman
    Nilai HPS : Rp629.580.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [2166054] PENGADAAN 1 (SATU) UNIT LIFT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	16-Jan-17	22-Jan-17	7	16-Jan-17	22-Jan-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	19-Jan-17	19-Jan-17	1	19-Jan-17	19-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	20-Jan-17	23-Jan-17	4	20-Jan-17	23-Jan-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	31-Jan-17	03-Feb-17	4	31-Jan-17	03-Feb-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	07-Feb-17	08-Feb-17	2	07-Feb-17	08-Feb-17	2	Tidak Ada

24. Nama Proyek : Tahap Lelang Saat Ini - [2169054] Bahan Pemugaran Candi Perwara Deret II No. 35 Kompleks Candi Prambanan
    Region : Kabupaten Sleman
    Nilai HPS : Rp897.096.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [2169054] Bahan Pemugaran Candi Perwara Deret II No. 35 Kompleks Candi Prambanan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	24-Jan-17	30-Jan-17	7	24-Jan-17	30-Jan-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	27-Jan-17	27-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	27-Jan-17	31-Jan-17	5	27-Jan-17	31-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	31-Jan-17	05-Feb-17	6	31-Jan-17	05-Feb-17	6	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	31-Jan-17	05-Feb-17	6	31-Jan-17	06-Feb-17	7	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	31-Jan-17	05-Feb-17	6	31-Jan-17	06-Feb-17	7	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	31-Jan-17	05-Feb-17	6	31-Jan-17	06-Feb-17	7	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31-Jan-17	05-Feb-17	6	31-Jan-17	06-Feb-17	7	Ada
10	Penetapan pemenang	31-Jan-17	05-Feb-17	6	31-Jan-17	06-Feb-17	7	Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Feb-17	06-Feb-17	1	07-Feb-17	07-Feb-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Feb-17	09-Feb-17	3	08-Feb-17	10-Feb-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Feb-17	10-Feb-17	1	13-Feb-17	13-Feb-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	13-Feb-17	13-Feb-17	1	14-Feb-17	15-Feb-17	2	Ada

25. Nama Proyek : Tahap Lelang Saat Ini - [2173054] Bahan Pemugaran Pagar Teras VIII Kompleks Candi Ijo

Region : Kabupaten Sleman

Nilai HPS : Rp293.200.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [2173054] Bahan Pemugaran Pagar Teras VIII Kompleks Candi Ijo								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10-Feb-17	16-Feb-17	7	10-Feb-17	16-Feb-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	10-Feb-17	17-Feb-17	8	10-Feb-17	17-Feb-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	13-Feb-17	13-Feb-17	1	13-Feb-17	13-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	13-Feb-17	17-Feb-17	5	13-Feb-17	17-Feb-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	17-Feb-17	21-Feb-17	5	17-Feb-17	21-Feb-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	17-Feb-17	23-Feb-17	7	17-Feb-17	23-Feb-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17-Feb-17	23-Feb-17	7	17-Feb-17	23-Feb-17	7	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	17-Feb-17	23-Feb-17	7	17-Feb-17	23-Feb-17	7	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23-Feb-17	24-Feb-17	2	23-Feb-17	24-Feb-17	2	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	23-Feb-17	24-Feb-17	2	23-Feb-17	24-Feb-17	2	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Feb-17	24-Feb-17	1	24-Feb-17	24-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Feb-17	27-Feb-17	3	25-Feb-17	27-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28-Feb-17	01-Mar-17	2	28-Feb-17	01-Mar-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	02-Mar-17	03-Mar-17	2	02-Mar-17	03-Mar-17	2	Tidak Ada

26. Nama Proyek : Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Rawit
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp921.885.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [1441367] Pengadaan Sarana Produksi Cabe Rawit Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Rawit								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Feb-17	08-Feb-17	6	03-Feb-17	08-Feb-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Feb-17	08-Feb-17	6	03-Feb-17	08-Feb-17	6	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	07-Feb-17	09-Feb-17	3	07-Feb-17	09-Feb-17	3	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	09-Feb-17	17-Feb-17	9	09-Feb-17	17-Feb-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	09-Feb-17	17-Feb-17	9	09-Feb-17	17-Feb-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	09-Feb-17	17-Feb-17	9	09-Feb-17	17-Feb-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	10-Feb-17	17-Feb-17	8	10-Feb-17	17-Feb-17	8	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13-Feb-17	17-Feb-17	5	17-Feb-17	17-Feb-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	13-Feb-17	17-Feb-17	5	17-Feb-17	17-Feb-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	13-Feb-17	17-Feb-17	5	17-Feb-17	17-Feb-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Feb-17	20-Feb-17	3	18-Feb-17	20-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Feb-17	22-Feb-17	2	22-Feb-17	28-Feb-17	7	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Feb-17	28-Feb-17	7	01-Mar-17	03-Mar-17	3	Ada

27. Nama Proyek : Pengadaan Sarana Produksi Cabe Besar (Merah Keriting) Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Besar
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp1.390.087.500,00

Tahap Lelang Saat Ini - [1446367] Pengadaan Sarana Produksi Cabe Besar (Merah Keriting) Dalam Rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani Cabe Besar

No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Feb-17	08-Feb-17	6	03-Feb-17	08-Feb-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Feb-17	08-Feb-17	6	03-Feb-17	08-Feb-17	6	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	07-Feb-17	09-Feb-17	3	07-Feb-17	09-Feb-17	3	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	09-Feb-17	17-Feb-17	9	09-Feb-17	17-Feb-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	09-Feb-17	17-Feb-17	9	09-Feb-17	17-Feb-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	09-Feb-17	17-Feb-17	9	09-Feb-17	17-Feb-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	10-Feb-17	17-Feb-17	8	10-Feb-17	17-Feb-17	8	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13-Feb-17	17-Feb-17	5	13-Feb-17	17-Feb-17	5	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	13-Feb-17	17-Feb-17	5	13-Feb-17	17-Feb-17	5	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	13-Feb-17	17-Feb-17	5	13-Feb-17	17-Feb-17	5	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Feb-17	20-Feb-17	3	18-Feb-17	20-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Feb-17	22-Feb-17	2	21-Feb-17	22-Feb-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Feb-17	28-Feb-17	7	22-Feb-17	28-Feb-17	7	Tidak Ada

28. Nama Proyek : Tahap Lelang Saat Ini - [1449367] Relokasi Pasar Bendungan
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp1.250.000.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [1449367] Relokasi Pasar Bendungan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	10-Feb-17	16-Feb-17	7	10-Feb-17	16-Feb-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	10-Feb-17	19-Feb-17	10	10-Feb-17	19-Feb-17	10	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	13-Feb-17	13-Feb-17	1	13-Feb-17	13-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	14-Feb-17	20-Feb-17	7	14-Feb-17	20-Feb-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Feb-17	24-Feb-17	5	20-Feb-17	24-Feb-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Feb-17	24-Feb-17	5	20-Feb-17	24-Feb-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Feb-17	24-Feb-17	5	20-Feb-17	24-Feb-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Feb-17	24-Feb-17	5	20-Feb-17	24-Feb-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	27-Feb-17	27-Feb-17	1	27-Feb-17	27-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	28-Feb-17	28-Feb-17	1	28-Feb-17	28-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	28-Feb-17	28-Feb-17	1	28-Feb-17	28-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	01-Mar-17	03-Mar-17	3	01-Mar-17	03-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	07-Mar-17	10-Mar-17	4	07-Mar-17	10-Mar-17	4	Tidak Ada

29. Nama Proyek : Belanja Langganan FIber Optik Backhaul, Belanja Langganan Fiber Optik Cabang dan Biaya Instalasi/Aktivasi
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp554.315.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [1453367] Belanja Langganan FIber Optik Backhaul, Belanja Langganan Fiber Optik Cabang dan Biaya Instalasi/Aktivasi								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Feb-17	23-Feb-17	7	17-Feb-17	23-Feb-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Feb-17	23-Feb-17	7	17-Feb-17	23-Feb-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Feb-17	20-Feb-17	1	20-Feb-17	20-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Feb-17	24-Feb-17	4	21-Feb-17	24-Feb-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	24-Feb-17	03-Mar-17	8	24-Feb-17	03-Mar-17	8	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	24-Feb-17	03-Mar-17	8	24-Feb-17	03-Mar-17	8	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	24-Feb-17	03-Mar-17	8	24-Feb-17	03-Mar-17	8	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	28-Feb-17	03-Mar-17	4	28-Feb-17	03-Mar-17	4	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	28-Feb-17	03-Mar-17	4	28-Feb-17	03-Mar-17	4	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	03-Mar-17	03-Mar-17	1	03-Mar-17	03-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	03-Mar-17	03-Mar-17	1	03-Mar-17	03-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	04-Mar-17	06-Mar-17	3	04-Mar-17	06-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07-Mar-17	07-Mar-17	1	07-Mar-17	07-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	08-Mar-17	14-Mar-17	7	08-Mar-17	14-Mar-17	7	Tidak Ada

30. Nama Proyek : Rabilitasi Jembatan Munggangwetan

Region : Kabupaten Kulon Progo

Nilai HPS : Rp489.668.000,00

Rehabilitasi Jembatan Munggangwetan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Mar-17	27-Mar-17	7	21-Mar-17	27-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	10-Apr-17	10-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	11-Apr-17	1	11-Apr-17	11-Apr-17	1	Tidak Ada

31. Nama Proyek : Rehabilitasi Jembatan Kaliduren
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp579.071.000,00

Rehabilitasi Jembatan Kaliduren								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Mar-17	27-Mar-17	7	21-Mar-17	27-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	10-Apr-17	10-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	11-Apr-17	1	11-Apr-17	11-Apr-17	1	Tidak Ada

32. Nama Proyek : Rehabilitasi Jembatan Trayu cs

Region : Kabupaten Kulon Progo

Nilai HPS : Rp742.174.000,00

Rehabilitasi Jembatan Trayu cs								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Mar-17	27-Mar-17	7	21-Mar-17	27-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	10-Apr-17	10-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	11-Apr-17	1	11-Apr-17	11-Apr-17	1	Tidak Ada

33. Nama Proyek : Rehabilitasi Jembatan Kalibuko
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp674.300.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [1484367] Rehabilitasi Jembatan Kalibuko								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Mar-17	27-Mar-17	7	21-Mar-17	27-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	10-Apr-17	10-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	11-Apr-17	1	11-Apr-17	11-Apr-17	1	Tidak Ada

34. Nama Proyek : Rehabilitasi Jembatan Brangkal
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp581.777.000,00

Rehabilitasi Jembatan Brangkal								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Mar-17	27-Mar-17	7	21-Mar-17	27-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	10-Apr-17	10-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	11-Apr-17	1	11-Apr-17	11-Apr-17	1	Tidak Ada

35. Nama Proyek : Peningkatan Jalan BD. Demangrejo - Karangasem (119)
    Region : Kabupaten Kulon Progo
    Nilai HPS : Rp922.085.000,00

Peningkatan Jalan BD. Demangrejo - Karangasem (119)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	21-Mar-17	27-Mar-17	7	21-Mar-17	27-Mar-17	7	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Mar-17	04-Apr-17	9	27-Mar-17	04-Apr-17	9	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	28-Mar-17	04-Apr-17	8	28-Mar-17	04-Apr-17	8	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Apr-17	06-Apr-17	1	06-Apr-17	06-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	10-Apr-17	1	10-Apr-17	10-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	24-Apr-17	14	11-Apr-17	24-Apr-17	14	Tidak Ada

36. Nama Proyek : Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Mina Padi (DAK 2017)
    Region : Kabupaten Gunung Kidul
    Nilai HPS : Rp359.800.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [571621] Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar Mina Padi (DAK 2017)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	09-Feb-17	13-Feb-17	5	09-Feb-17	13-Feb-17	5	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	09-Feb-17	15-Feb-17	7	09-Feb-17	15-Feb-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	13-Feb-17	13-Feb-17	1	13-Feb-17	13-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	14-Feb-17	16-Feb-17	3	14-Feb-17	16-Feb-17	3	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	16-Feb-17	21-Feb-17	6	16-Feb-17	21-Feb-17	6	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	17-Feb-17	21-Feb-17	5	17-Feb-17	21-Feb-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17-Feb-17	21-Feb-17	5	17-Feb-17	21-Feb-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	17-Feb-17	21-Feb-17	5	17-Feb-17	21-Feb-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21-Feb-17	21-Feb-17	1	21-Feb-17	21-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	21-Feb-17	21-Feb-17	1	21-Feb-17	21-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	21-Feb-17	21-Feb-17	1	21-Feb-17	21-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	22-Feb-17	24-Feb-17	3	22-Feb-17	24-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	27-Feb-17	28-Feb-17	2	27-Feb-17	28-Feb-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	01-Mar-17	07-Mar-17	7	01-Mar-17	07-Mar-17	7	Tidak Ada

37. Nama Proyek : Pengadaan cabai besar Fasilitasi bantuan kepada petani cabai besar

Region : Kabupaten Gunung Kidul

Nilai HPS : Rp1.270.722.000,00

Pengadaan cabai besar Fasilitasi bantuan kepada petani cabai besar								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	02-Mar-17	09-Mar-17	8	02-Mar-17	09-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	07-Mar-17	10-Mar-17	4	07-Mar-17	10-Mar-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
10	Penetapan pemenang	16-Mar-17	17-Mar-17	2	16-Mar-17	20-Mar-17	5	Ada
11	Pengumuman Pemenang	16-Mar-17	17-Mar-17	2	16-Mar-17	20-Mar-17	5	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Mar-17	20-Mar-17	3	21-Mar-17	23-Mar-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Mar-17	22-Mar-17	2	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	23-Mar-17	31-Mar-17	9	25-Mar-17	31-Mar-17	7	Ada

38. Nama Proyek : Pengadaan bibit bawang merah Fasilitasi Bantuan kepada petania bawang merah
    Region : Kabupaten Gunung Kidul
    Nilai HPS : Rp1.998.000.000,00

Pengadaan bibit bawang merah Fasilitasi Bantuan kepada petania bawang merah								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	02-Mar-17	06-Mar-17	5	02-Mar-17	06-Mar-17	5	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	02-Mar-17	09-Mar-17	8	02-Mar-17	09-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	07-Mar-17	10-Mar-17	4	07-Mar-17	10-Mar-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	10-Mar-17	10-Mar-17	1	10-Mar-17	10-Mar-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11-Mar-17	17-Mar-17	7	11-Mar-17	20-Mar-17	10	Ada
10	Penetapan pemenang	16-Mar-17	17-Mar-17	2	16-Mar-17	20-Mar-17	5	Ada
11	Pengumuman Pemenang	16-Mar-17	17-Mar-17	2	16-Mar-17	20-Mar-17	5	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Mar-17	20-Mar-17	3	21-Mar-17	23-Mar-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Mar-17	22-Mar-17	2	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	23-Mar-17	31-Mar-17	9	25-Mar-17	31-Mar-17	7	Ada

39. Nama Proyek : Penataan pertamanan halaman Selatan Gedung Induk di Istana Kepresidenan Yogyakarta
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp382.030.000,00

Penataan pertamanan halaman Selatan Gedung Induk di Istana Kepresidenan Yogyakarta								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	29-Mar-17	03-Apr-17	6	29-Mar-17	03-Apr-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	29-Mar-17	03-Apr-17	6	29-Mar-17	03-Apr-17	6	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	31-Mar-17	31-Mar-17	1	31-Mar-17	31-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	31-Mar-17	05-Apr-17	6	31-Mar-17	05-Apr-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	05-Apr-17	05-Apr-17	1	05-Apr-17	05-Apr-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	05-Apr-17	07-Apr-17	3	05-Apr-17	07-Apr-17	3	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06-Apr-17	07-Apr-17	2	06-Apr-17	07-Apr-17	2	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	07-Apr-17	07-Apr-17	1	07-Apr-17	07-Apr-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	07-Apr-17	07-Apr-17	1	07-Apr-17	07-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	07-Apr-17	07-Apr-17	1	07-Apr-17	07-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	07-Apr-17	07-Apr-17	1	07-Apr-17	07-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	07-Apr-17	10-Apr-17	4	07-Apr-17	10-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Apr-17	11-Apr-17	2	10-Apr-17	11-Apr-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	11-Apr-17	14-Apr-17	4	11-Apr-17	14-Apr-17	4	Tidak Ada

40. Nama Proyek : Renovasi Balai RW 8,9,10 Semaki
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp799.999.953,69

Renovasi Balai RW 8,9,10 Semaki								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31-Mar-17	07-Apr-17	8	31-Mar-17	07-Apr-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	31-Mar-17	07-Apr-17	8	31-Mar-17	07-Apr-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	03-Apr-17	03-Apr-17	1	03-Apr-17	03-Apr-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	03-Apr-17	07-Apr-17	5	03-Apr-17	07-Apr-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	07-Apr-17	13-Apr-17	7	07-Apr-17	13-Apr-17	7	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	07-Apr-17	13-Apr-17	7	07-Apr-17	13-Apr-17	7	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07-Apr-17	13-Apr-17	7	07-Apr-17	13-Apr-17	7	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	07-Apr-17	13-Apr-17	7	07-Apr-17	13-Apr-17	7	Tidak Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	07-Apr-17	13-Apr-17	7	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	13-Apr-17	13-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	13-Apr-17	13-Apr-17	1	13-Apr-17	13-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	14-Apr-17	17-Apr-17	4	14-Apr-17	17-Apr-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18-Apr-17	18-Apr-17	1	18-Apr-17	18-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	19-Apr-17	21-Apr-17	3	19-Apr-17	21-Apr-17	3	Tidak Ada

41. Nama Proyek : Belanja Jasa Keamanan RS Pratama
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp261.724.125,00

Belanja Jasa Keamanan RS Pratama								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	14-Jan-17	20-Jan-17	7	15-Jan-17	20-Jan-17	6	Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	14-Jan-17	20-Jan-17	7	15-Jan-17	20-Jan-17	6	Ada
3	Pemberian Penjelasan	17-Jan-17	17-Jan-17	1	17-Jan-17	17-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	17-Jan-17	20-Jan-17	4	17-Jan-17	20-Jan-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	01-Feb-17	2	31-Jan-17	01-Feb-17	2	Tidak Ada

42. Nama Proyek : Jasa Pembersihan Jalan Sektor Malioboro (11 bln)
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp333.043.000,00

Jasa Pembersihan Jalan Sektor Malioboro (11 bln)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	14-Jan-17	20-Jan-17	7	14-Jan-17	20-Jan-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	14-Jan-17	20-Jan-17	7	14-Jan-17	20-Jan-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	17-Jan-17	17-Jan-17	1	17-Jan-17	17-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	17-Jan-17	20-Jan-17	4	17-Jan-17	20-Jan-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	25-Jan-17	6	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	25-Jan-17	6	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	25-Jan-17	6	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	25-Jan-17	6	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-Jan-17	25-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	25-Jan-17	25-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	25-Jan-17	25-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	26-Jan-17	28-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada

43. Nama Proyek : Pembangunan Ruang Produksi Audio/Vidio LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp1.985.000.000,00

Pembangunan Ruang Produksi Audio/Vidio LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	16-Jan-17	22-Jan-17	7	16-Jan-17	22-Jan-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	16-Jan-17	22-Jan-17	7	16-Jan-17	22-Jan-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	18-Jan-17	18-Jan-17	1	18-Jan-17	18-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	18-Jan-17	26-Jan-17	9	18-Jan-17	26-Jan-17	9	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	26-Jan-17	26-Jan-17	1	26-Jan-17	26-Jan-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	26-Jan-17	06-Feb-17	12	26-Jan-17	06-Feb-17	12	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27-Jan-17	06-Feb-17	11	27-Jan-17	06-Feb-17	11	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Jan-17	06-Feb-17	11	27-Jan-17	06-Feb-17	11	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	06-Feb-17	10-Feb-17	5	06-Feb-17	10-Feb-17	5	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10-Feb-17	16-Feb-17	7	10-Feb-17	17-Feb-17	8	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	16-Feb-17	27-Feb-17	12	17-Feb-17	27-Feb-17	11	Ada

44. Peserta Diklat Prajabatan Pola Transisi Gol III (IPDN Yogyakarta)

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp1.337.600.000,00

Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Prajabatan Pola Transisi Gol III (IPDN Yogyakarta)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	07-Feb-17	10-Feb-17	4	07-Feb-17	10-Feb-17	4	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	07-Feb-17	10-Feb-17	4	07-Feb-17	10-Feb-17	4	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	09-Feb-17	09-Feb-17	1	09-Feb-17	09-Feb-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	09-Feb-17	13-Feb-17	5	09-Feb-17	13-Feb-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13-Feb-17	13-Feb-17	1	13-Feb-17	13-Feb-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	13-Feb-17	14-Feb-17	2	13-Feb-17	16-Feb-17	4	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13-Feb-17	14-Feb-17	2	13-Feb-17	16-Feb-17	4	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	13-Feb-17	14-Feb-17	2	13-Feb-17	16-Feb-17	4	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14-Feb-17	14-Feb-17	1	16-Feb-17	16-Feb-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	16-Feb-17	16-Feb-17	1	16-Feb-17	20-Feb-17	5	Ada
11	Pengumuman Pemenang	14-Feb-17	14-Feb-17	1	20-Feb-17	20-Feb-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	14-Feb-17	16-Feb-17	3	21-Feb-17	23-Feb-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16-Feb-17	16-Feb-17	1	23-Feb-17	24-Feb-17	2	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	17-Feb-17	17-Feb-17	1	24-Feb-17	27-Feb-17	4	Ada

45. Nama Proyek : Pembangunan SAH Jl. Danurejan
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp584.926.143,25

Pembangunan SAH Jl. Danurejan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	10-Mar-17	5	06-Mar-17	10-Mar-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	16-Mar-17	7	Ada
6	Evaluasi penawaran	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	16-Mar-17	7	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	16-Mar-17	7	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	16-Mar-17	7	Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	14-Mar-17	14-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	14-Mar-17	14-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	14-Mar-17	14-Mar-17	1	16-Mar-17	17-Mar-17	2	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	15-Mar-17	17-Mar-17	3	17-Mar-17	20-Mar-17	4	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20-Mar-17	21-Mar-17	2	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Mar-17	24-Mar-17	3	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Tidak Ada

46. Nama Proyek : Pembangunan SAH Jl. Suryodiningratan
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp1.599.892.401,25

Pembangunan SAH Jl. Suryodiningratan								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	02-Mar-17	10-Mar-17	9	02-Mar-17	10-Mar-17	9	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	02-Mar-17	10-Mar-17	9	02-Mar-17	10-Mar-17	9	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	14-Mar-17	9	06-Mar-17	14-Mar-17	9	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	17-Mar-17	20-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17-Mar-17	20-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	17-Mar-17	20-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	20-Mar-17	20-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	20-Mar-17	20-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	21-Mar-17	23-Mar-17	3	18-Mar-17	20-Mar-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24-Mar-17	24-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	27-Mar-17	29-Mar-17	3	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Ada

47. Nama Proyek : Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Kec. MJ
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp488.298.562,72

Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Kec. MJ								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	14-Mar-17	12	03-Mar-17	14-Mar-17	12	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	14-Mar-17	12	03-Mar-17	14-Mar-17	12	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	14-Mar-17	9	06-Mar-17	14-Mar-17	9	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	17-Mar-17	17-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	17-Mar-17	17-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	17-Mar-17	17-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Mar-17	20-Mar-17	3	18-Mar-17	20-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Mar-17	21-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Mar-17	24-Mar-17	3	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Tidak Ada

48. Nama Proyek : Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Komputer Kebutuhan F MIPA
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp252.525.003,50

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Komputer Kebutuhan F MIPA								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	09-Mar-17	7	03-Mar-17	09-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	09-Mar-17	7	03-Mar-17	09-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	13-Mar-17	8	06-Mar-17	13-Mar-17	8	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	13-Mar-17	20-Mar-17	8	13-Mar-17	20-Mar-17	8	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14-Mar-17	20-Mar-17	7	14-Mar-17	20-Mar-17	7	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	14-Mar-17	20-Mar-17	7	14-Mar-17	20-Mar-17	7	Tidak Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	20-Mar-17	24-Mar-17	5	20-Mar-17	24-Mar-17	5	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24-Mar-17	31-Mar-17	8	24-Mar-17	31-Mar-17	8	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Mar-17	14-Apr-17	15	31-Mar-17	14-Apr-17	15	Tidak Ada

49. Nama Proyek : Pengadaan dan Pemasangan Gordyn Gedung Induk

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp472.505.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Gordyn Gedung Induk								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	06-Mar-17	4	03-Mar-17	06-Mar-17	4	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	13-Mar-17	8	06-Mar-17	13-Mar-17	8	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13-Mar-17	13-Mar-17	1	13-Mar-17	13-Mar-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	13-Mar-17	15-Mar-17	3	13-Mar-17	15-Mar-17	3	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14-Mar-17	15-Mar-17	2	14-Mar-17	15-Mar-17	2	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	15-Mar-17	15-Mar-17	1	15-Mar-17	15-Mar-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16-Mar-17	16-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	16-Mar-17	16-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	16-Mar-17	16-Mar-17	1	16-Mar-17	16-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	16-Mar-17	20-Mar-17	5	16-Mar-17	20-Mar-17	5	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	21-Mar-17	24-Mar-17	4	21-Mar-17	24-Mar-17	4	Tidak Ada

50. Nama Proyek : Peningkatan Jembatan Karangrejo

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp3.198.836.430,67

Peningkatan Jembatan Karangrejo								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	14-Mar-17	9	06-Mar-17	14-Mar-17	9	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	14-Mar-17	17-Mar-17	4	14-Mar-17	17-Mar-17	4	Tidak Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	17-Mar-17	17-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	17-Mar-17	17-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	17-Mar-17	17-Mar-17	1	17-Mar-17	17-Mar-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	18-Mar-17	20-Mar-17	3	18-Mar-17	20-Mar-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21-Mar-17	21-Mar-17	1	21-Mar-17	21-Mar-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Mar-17	24-Mar-17	3	22-Mar-17	24-Mar-17	3	Tidak Ada

51. Nama Proyek : Perbaikan Gapura Batas Kota Jalan Solo

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp469.532.648,65

Perbaikan Gapura Batas Kota Jalan Solo								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	03-Mar-17	10-Mar-17	8	03-Mar-17	10-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	06-Mar-17	06-Mar-17	1	06-Mar-17	06-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	06-Mar-17	10-Mar-17	5	06-Mar-17	10-Mar-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	17-Mar-17	8	Ada
6	Evaluasi penawaran	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	20-Mar-17	11	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	20-Mar-17	11	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	10-Mar-17	14-Mar-17	5	10-Mar-17	20-Mar-17	11	Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	14-Mar-17	14-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	14-Mar-17	14-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	14-Mar-17	14-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	15-Mar-17	17-Mar-17	3	20-Mar-17	22-Mar-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20-Mar-17	21-Mar-17	2	23-Mar-17	23-Mar-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	22-Mar-17	24-Mar-17	3	24-Mar-17	24-Mar-17	1	Ada

52. Nama Proyek : Belanja Barang Berupa Jas Almamater dan Kaos Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp708.275.000,00

Belanja Barang Berupa Jas Almamater dan Kaos Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	06-Mar-17	13-Mar-17	8	06-Mar-17	13-Mar-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	06-Mar-17	13-Mar-17	8	06-Mar-17	13-Mar-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	08-Mar-17	08-Mar-17	1	08-Mar-17	08-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	08-Mar-17	13-Mar-17	6	08-Mar-17	13-Mar-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	13-Mar-17	17-Mar-17	5	13-Mar-17	17-Mar-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	13-Mar-17	17-Mar-17	5	13-Mar-17	17-Mar-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13-Mar-17	17-Mar-17	5	13-Mar-17	17-Mar-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	13-Mar-17	17-Mar-17	5	13-Mar-17	17-Mar-17	5	Tidak Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	17-Mar-17	20-Mar-17	4	17-Mar-17	20-Mar-17	4	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	17-Mar-17	17-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	17-Mar-17	24-Mar-17	8	20-Mar-17	24-Mar-17	5	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	17-Mar-17	24-Mar-17	8	20-Mar-17	24-Mar-17	5	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	24-Mar-17	27-Mar-17	4	24-Mar-17	27-Mar-17	4	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	27-Mar-17	03-Apr-17	8	27-Mar-17	03-Apr-17	8	Tidak Ada

53. Nama Proyek : Peningkatan Jalan Veteran (DAK)
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp4.142.519.340,52

Tahap Lelang Saat Ini - [3252021] Peningkatan Jalan Veteran (DAK)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	17-Mar-17	23-Mar-17	7	17-Mar-17	23-Mar-17	7	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	20-Mar-17	20-Mar-17	1	20-Mar-17	20-Mar-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	20-Mar-17	23-Mar-17	4	20-Mar-17	23-Mar-17	4	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	23-Mar-17	27-Mar-17	5	23-Mar-17	27-Mar-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	23-Mar-17	27-Mar-17	5	23-Mar-17	27-Mar-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	23-Mar-17	27-Mar-17	5	23-Mar-17	27-Mar-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	23-Mar-17	27-Mar-17	5	23-Mar-17	27-Mar-17	5	Tidak Ada
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	27-Mar-17	27-Mar-17	1	27-Mar-17	27-Mar-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	27-Mar-17	27-Mar-17	1	27-Mar-17	27-Mar-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	27-Mar-17	27-Mar-17	1	27-Mar-17	28-Mar-17	2	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	28-Mar-17	31-Mar-17	4	28-Mar-17	31-Mar-17	4	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	03-Apr-17	04-Apr-17	2	03-Apr-17	04-Apr-17	2	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	05-Apr-17	13-Apr-17	9	05-Apr-17	13-Apr-17	9	Tidak Ada

54. Nama Proyek : Pengendalian Kawasan Alun-Alun Utara
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp963.809.000,00

Pengendalian Kawasan Alun-Alun Utara								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada

55. Nama Proyek : Pengendalian Kawasan Titik Nol Kilometer

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp1.122.305.000,00

Tahap Lelang Saat Ini - [3196021] Pengendalian Kawasan Titik Nol Kilometer								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada

56. Nama Proyek : Bahan Film dan Pengolah Film Badge

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp836.790.000,00

Bahan Film dan Pengolah Film Badge								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	12-Jan-17	17-Jan-17	6	12-Jan-17	17-Jan-17	6	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	12-Jan-17	19-Jan-17	8	12-Jan-17	19-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	17-Jan-17	17-Jan-17	1	17-Jan-17	17-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	18-Jan-17	20-Jan-17	3	18-Jan-17	20-Jan-17	3	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	23-Jan-17	23-Jan-17	1	23-Jan-17	23-Jan-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	24-Jan-17	25-Jan-17	2	24-Jan-17	25-Jan-17	2	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26-Jan-17	26-Jan-17	1	26-Jan-17	26-Jan-17	1	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	27-Jan-17	27-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	31-Jan-17	02-Feb-17	3	31-Jan-17	02-Feb-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	03-Feb-17	03-Feb-17	1	03-Feb-17	03-Feb-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	06-Feb-17	06-Feb-17	1	06-Feb-17	06-Feb-17	1	Tidak Ada

57. Nama Proyek : Pengamanan Komplek Balaikota

Region : Kota Yogyakarta

Nilai HPS : Rp1.738.518.000,00

Pengamanan Komplek Balaikota								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	31-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Tidak Ada

58. Nama Proyek : Belanja Jasa Keamanan Satpam (Security) Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp315.783.000,00

Belanja Jasa Keamanan Satpam (Security) Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	24-Jan-17	9	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	01-Feb-17	2	31-Jan-17	01-Feb-17	2	Tidak Ada

59. Nama Proyek : Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Kraton (11 bulan)
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp931.523.000,00

Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Kraton (11 bulan)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	23-Jan-17	8	Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	23-Jan-17	24-Jan-17	2	Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	23-Jan-17	24-Jan-17	2	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	23-Jan-17	24-Jan-17	2	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	23-Jan-17	24-Jan-17	2	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	01-Feb-17	2	31-Jan-17	01-Feb-17	2	Tidak Ada

60. Nama Proyek : Jasa Pembersihan Jalan Sektor Tungkak (11 bln)
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp381.350.000,00

Jasa Pembersihan Jalan Sektor Tungkak (11 bln)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	27-Jan-17	8	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	27-Jan-17	8	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	27-Jan-17	8	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	25-Jan-17	1	28-Jan-17	30-Jan-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	31-Jan-17	1	01-Feb-17	01-Feb-17	1	Ada

61. Nama Proyek : Jasa Pembersihan Jalan Sektor Kotagede (11 bln)
    Region : Kota Yogyakarta
    Nilai HPS : Rp365.047.000,00

Jasa Pembersihan Jalan Sektor Kotagede (11 bln)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	15-Jan-17	15-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	15-Jan-17	20-Jan-17	6	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	27-Jan-17	8	Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	27-Jan-17	8	Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	27-Jan-17	8	Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	27-Jan-17	27-Jan-17	1	Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	17-Jan-17	-7	28-Jan-17	30-Jan-17	3	Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	31-Jan-17	31-Jan-17	1	Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	31-Jan-17	1	01-Feb-17	01-Feb-17	1	Ada

62. Nama Proyek : Pemeliharaan Pohon Perindang Tepi Jalan (tinggi < 9 m, 1.260 batang) (11 bulan)
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp221.266.000,00

Pemeliharaan Pohon Perindang Tepi Jalan (tinggi < 9 m, 1.260 batang) (11 bulan)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	01-Feb-17	2	31-Jan-17	01-Feb-17	2	Tidak Ada

63. Nama Proyek : Jaket Almamater UPN
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp562.375.000,00

Jaket Almamater UPN								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	04-Apr-17	11-Apr-17	8	04-Apr-17	11-Apr-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	04-Apr-17	11-Apr-17	8	04-Apr-17	11-Apr-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	07-Apr-17	07-Apr-17	1	07-Apr-17	07-Apr-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	07-Apr-17	12-Apr-17	6	07-Apr-17	12-Apr-17	6	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	12-Apr-17	12-Apr-17	1	12-Apr-17	12-Apr-17	1	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	13-Apr-17	20-Apr-17	8	13-Apr-17	20-Apr-17	8	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13-Apr-17	20-Apr-17	8	13-Apr-17	20-Apr-17	8	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	17-Apr-17	19-Apr-17	3	17-Apr-17	19-Apr-17	3	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	20-Apr-17	20-Apr-17	1	20-Apr-17	20-Apr-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	20-Apr-17	20-Apr-17	1	20-Apr-17	20-Apr-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	20-Apr-17	20-Apr-17	1	20-Apr-17	20-Apr-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	21-Apr-17	23-Apr-17	3	21-Apr-17	23-Apr-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25-Apr-17	25-Apr-17	1	25-Apr-17	25-Apr-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	27-Apr-17	27-Apr-17	1	27-Apr-17	27-Apr-17	1	Tidak Ada

64. Nama Proyek : Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Malioboro (11 bulan)
Region : Kota Yogyakarta
Nilai HPS : Rp1.297.092.000,00

Jasa Pengangkutan Sampah Kawasan Malioboro (11 bulan)								
No	Tahap	Mulai	Sampai	Durasi Prediksi	Mulai	Sampai	Durasi Aktual	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pengadaan	13-Jan-17	20-Jan-17	8	13-Jan-17	20-Jan-17	8	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	16-Jan-17	16-Jan-17	1	16-Jan-17	16-Jan-17	1	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	16-Jan-17	20-Jan-17	5	16-Jan-17	20-Jan-17	5	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
6	Evaluasi penawaran	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
8	Pembuktian Kualifikasi	20-Jan-17	24-Jan-17	5	20-Jan-17	24-Jan-17	5	Tidak Ada
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
10	Penetapan pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
11	Pengumuman Pemenang	24-Jan-17	24-Jan-17	1	24-Jan-17	24-Jan-17	1	Tidak Ada
12	Masa Sanggah Hasil Lelang	25-Jan-17	27-Jan-17	3	25-Jan-17	27-Jan-17	3	Tidak Ada
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30-Jan-17	30-Jan-17	1	30-Jan-17	30-Jan-17	1	Tidak Ada
14	Penandatanganan Kontrak	31-Jan-17	01-Feb-17	2	31-Jan-17	01-Feb-17	2	Tidak Ada
